


Auszug Projektablaufplan – Stand 07/2026 zu LV 02 Container

Leistungsteil Aufbau inkl. Erdbau

10.2			Container	181at	Do, 09.07.26	Mi, 31.03.27		
10.2.1			Tiefbau/Leitungsverlegung für Anschluss Container - Bestand zu Übergabepunkt	20at	Do, 09.07.26	Mi, 05.08.26		0650.30
10.2.2			Tiefbau/Leitungsverlegung Trafo zu Übergabepunkt	61at	Mo, 04.01.27	Mi, 31.03.27		0650.30
10.2.3			Gründung - vorbehaltlich Witterung !	10at	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27		AN CON
10.2.4			Aufbau Container	35at	Mo, 25.01.27	Fr, 12.03.27	10.2.3EA;	AN CON
10.2.5			Anschlüsse TGA + Wege	10at	Mo, 15.03.27	Di, 30.03.27	10.2.4EA;	AN CON
10.2.6			aus BP 0 - neue BMA-Zentrale inkl. Ausbau Kabelwege im Kriechkeller	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27		IBS

Leistungsteil Rückbau inkl. Wiederherstellung

10.10			Rückbau Container	28at	Mo, 12.03.29	Fr, 20.04.29		
10.10.1			Demontage Medien	5at	Mo, 12.03.29	Fr, 16.03.29		0650.30
10.10.2			Demontage Container	3at	Mo, 19.03.29	Mi, 21.03.29	10.10.1EA;	AN CON
10.10.3			Wiederherstellung Freianlagen	20at	Do, 22.03.29	Fr, 20.04.29	10.10.2EA;	AN CON

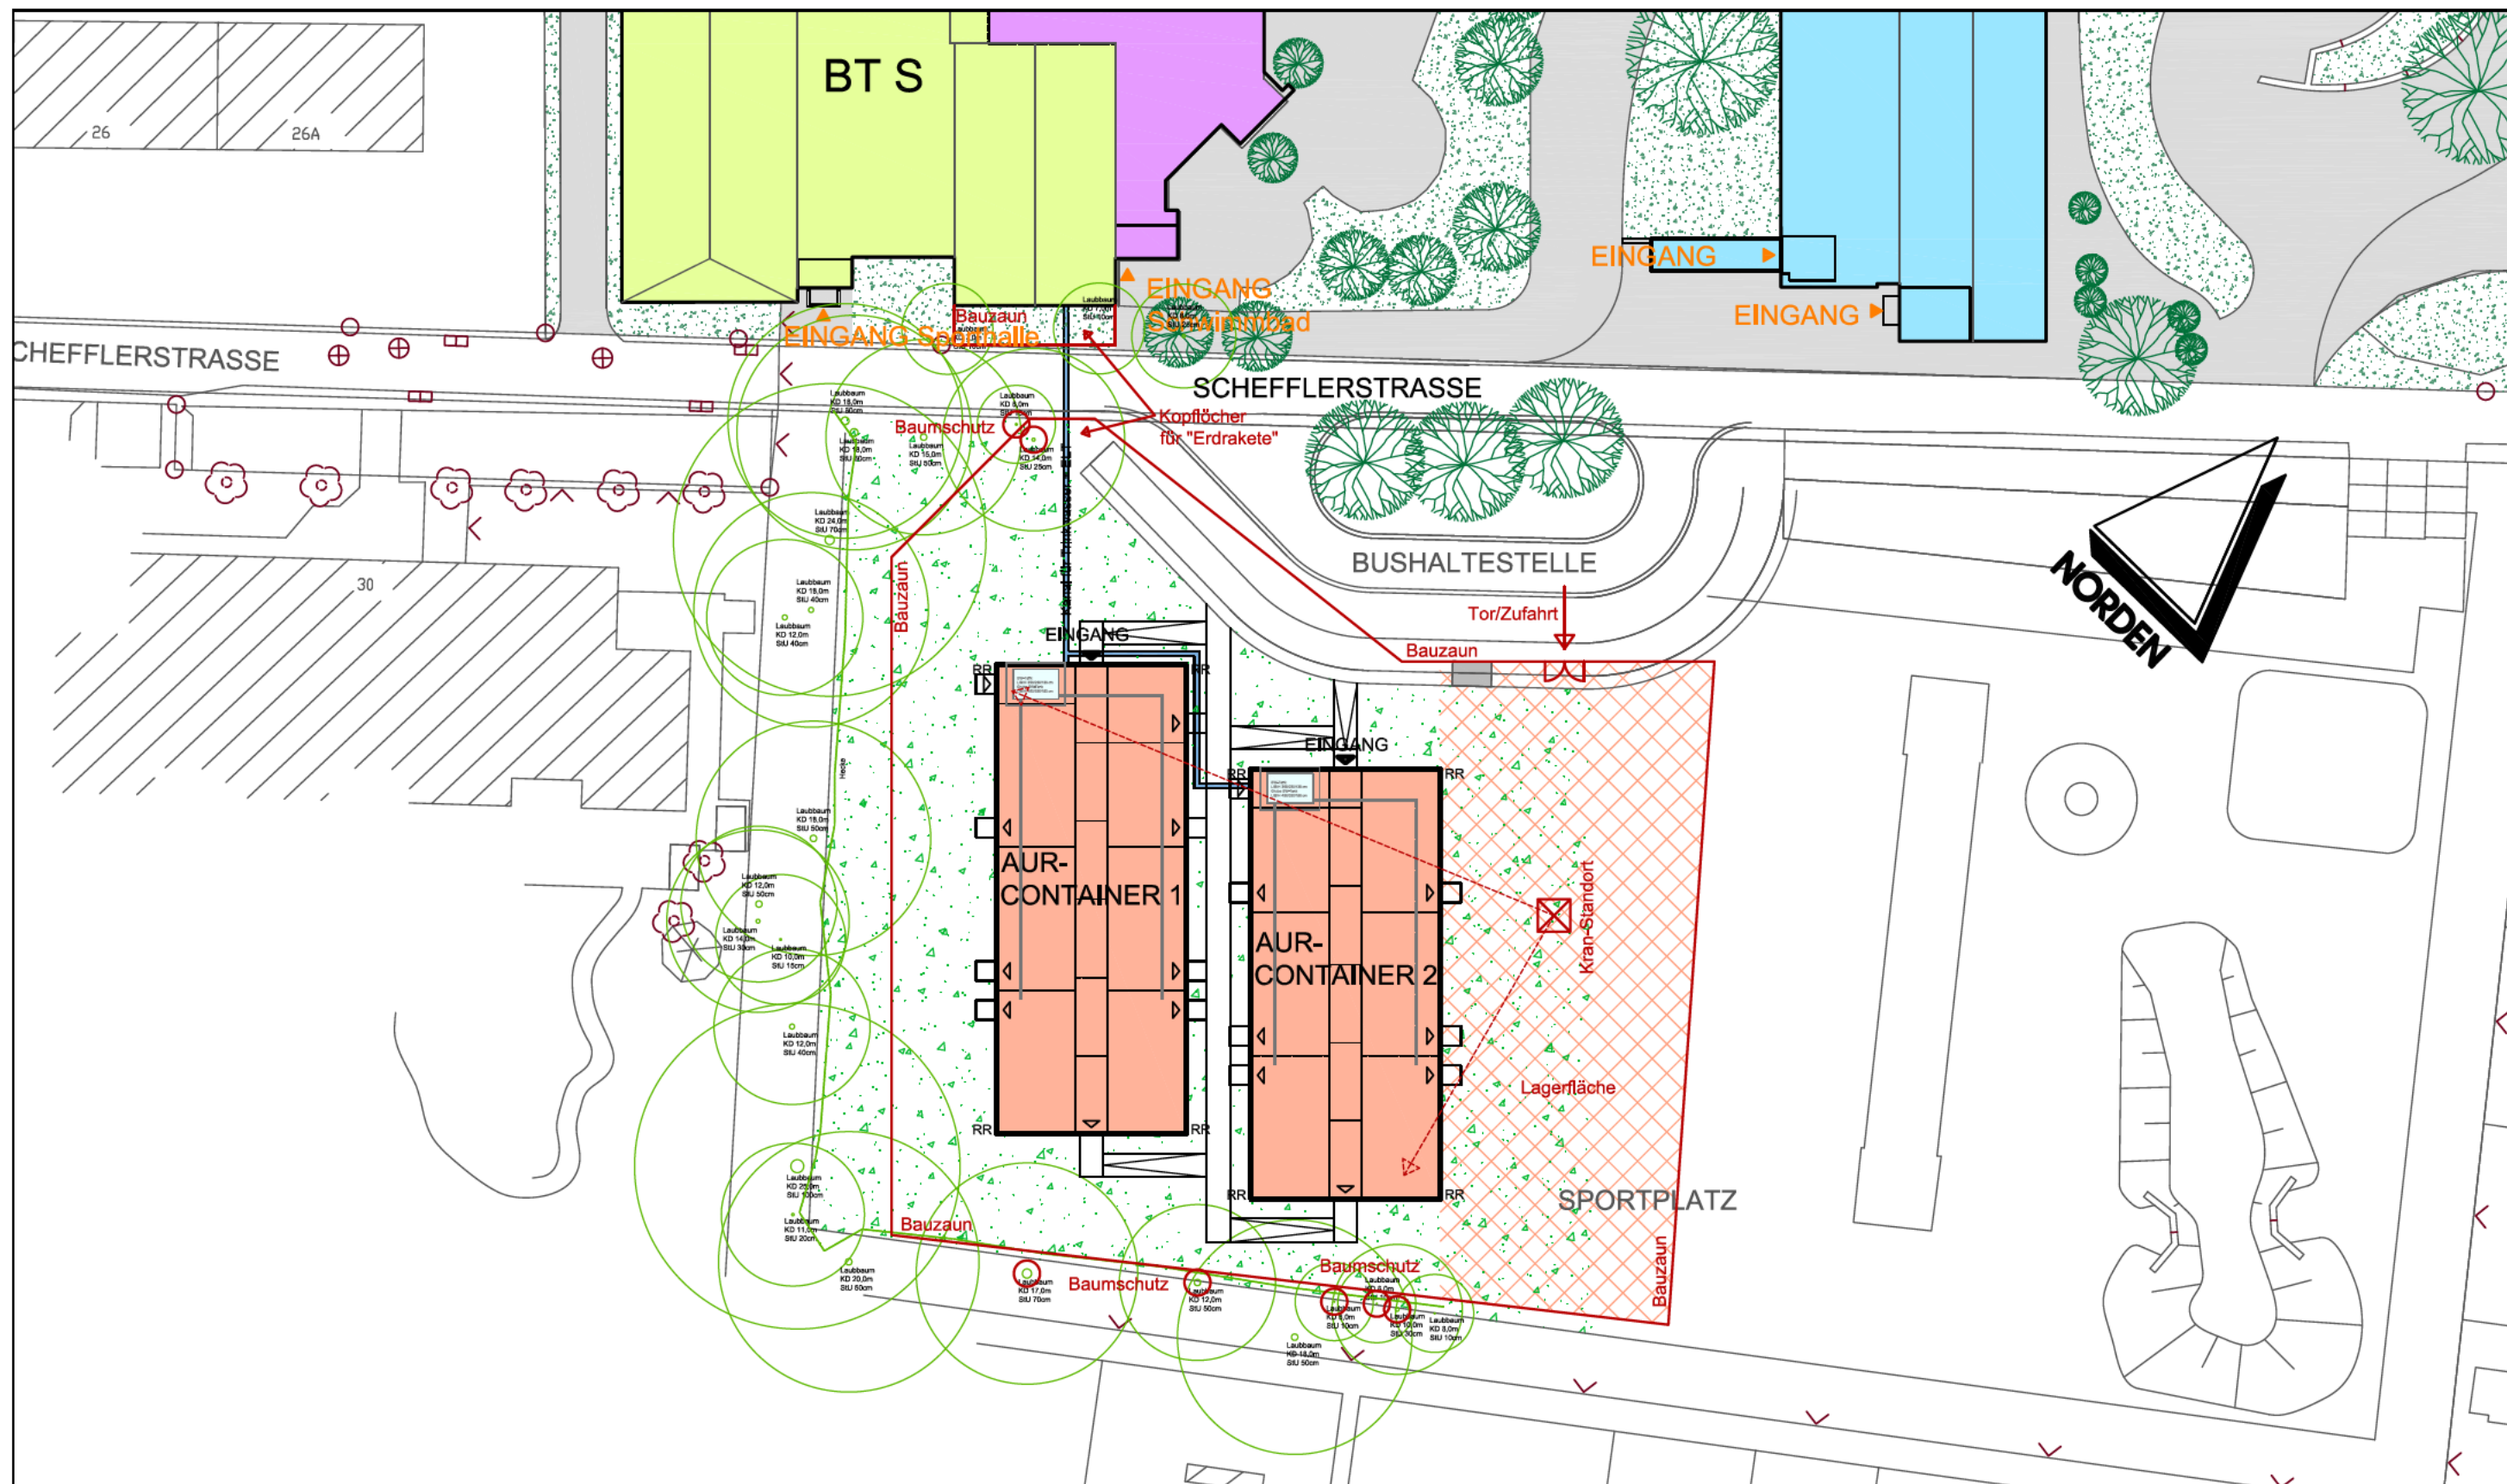



Baustelleneinrichtung Container:

- Bauzaun ca. 250m
- Kran Standort gilt als Vorschlag

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN! DIE GEPRÜFTE STATIK IST ZU BEACHTEN!

BAUVORHABEN	WE00395 GS BEBELHOF/ FÖS H.-WÜRTZ BRANDSCHUTZSANIERUNG KRUPPSTR. 24A · 38126 BS	ARCHITEKTEN				
BAUHERR	STADT BRAUNSCHWEIG REFERAT HOCHBAU WILLY-BRANDT-PLATZ 13 · 38102 BS					
PLANINHALT	BAUSTELLENEINRICHTUNG CONTAINER - AUSFÜHRUNG	MASSSTAB	DATUM	GEZ.: Je/ab	PLAN-NR. ARCHITEKT: 0-2021-6	
		1 : 500	13.04.2026	CAD-NR.:0-2021-6	PLAN-NR. FACH-ING.:	

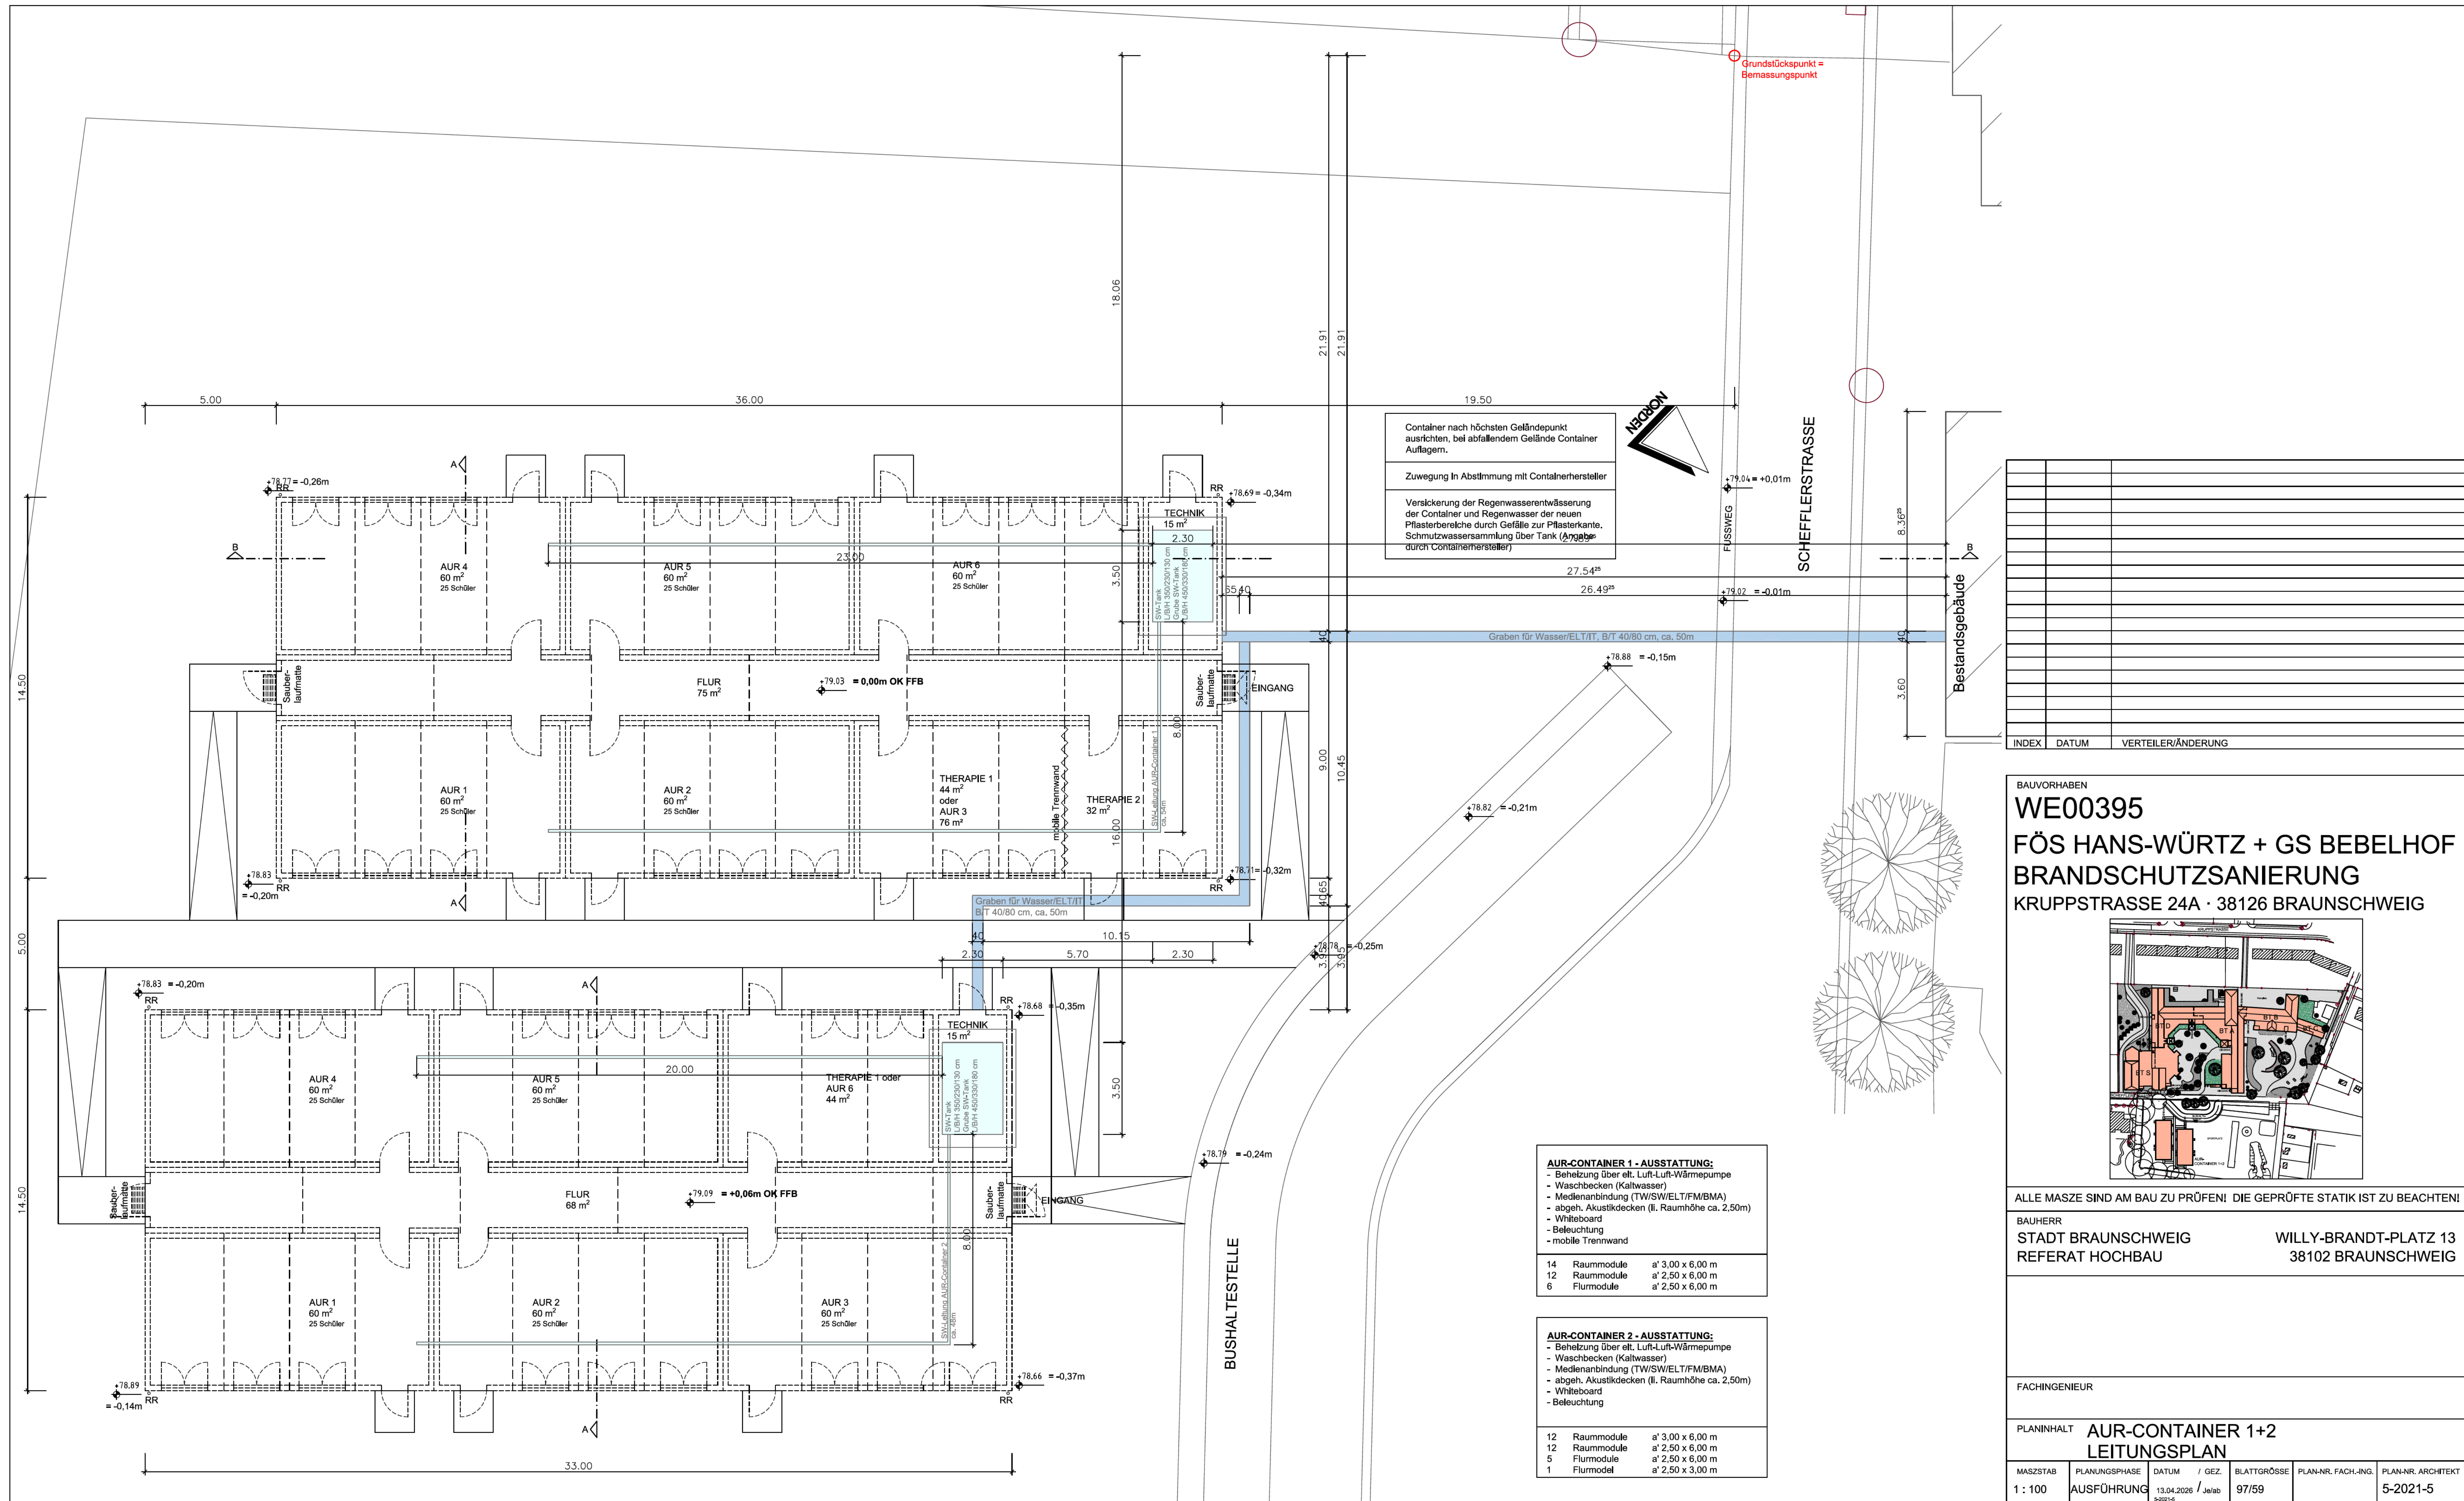

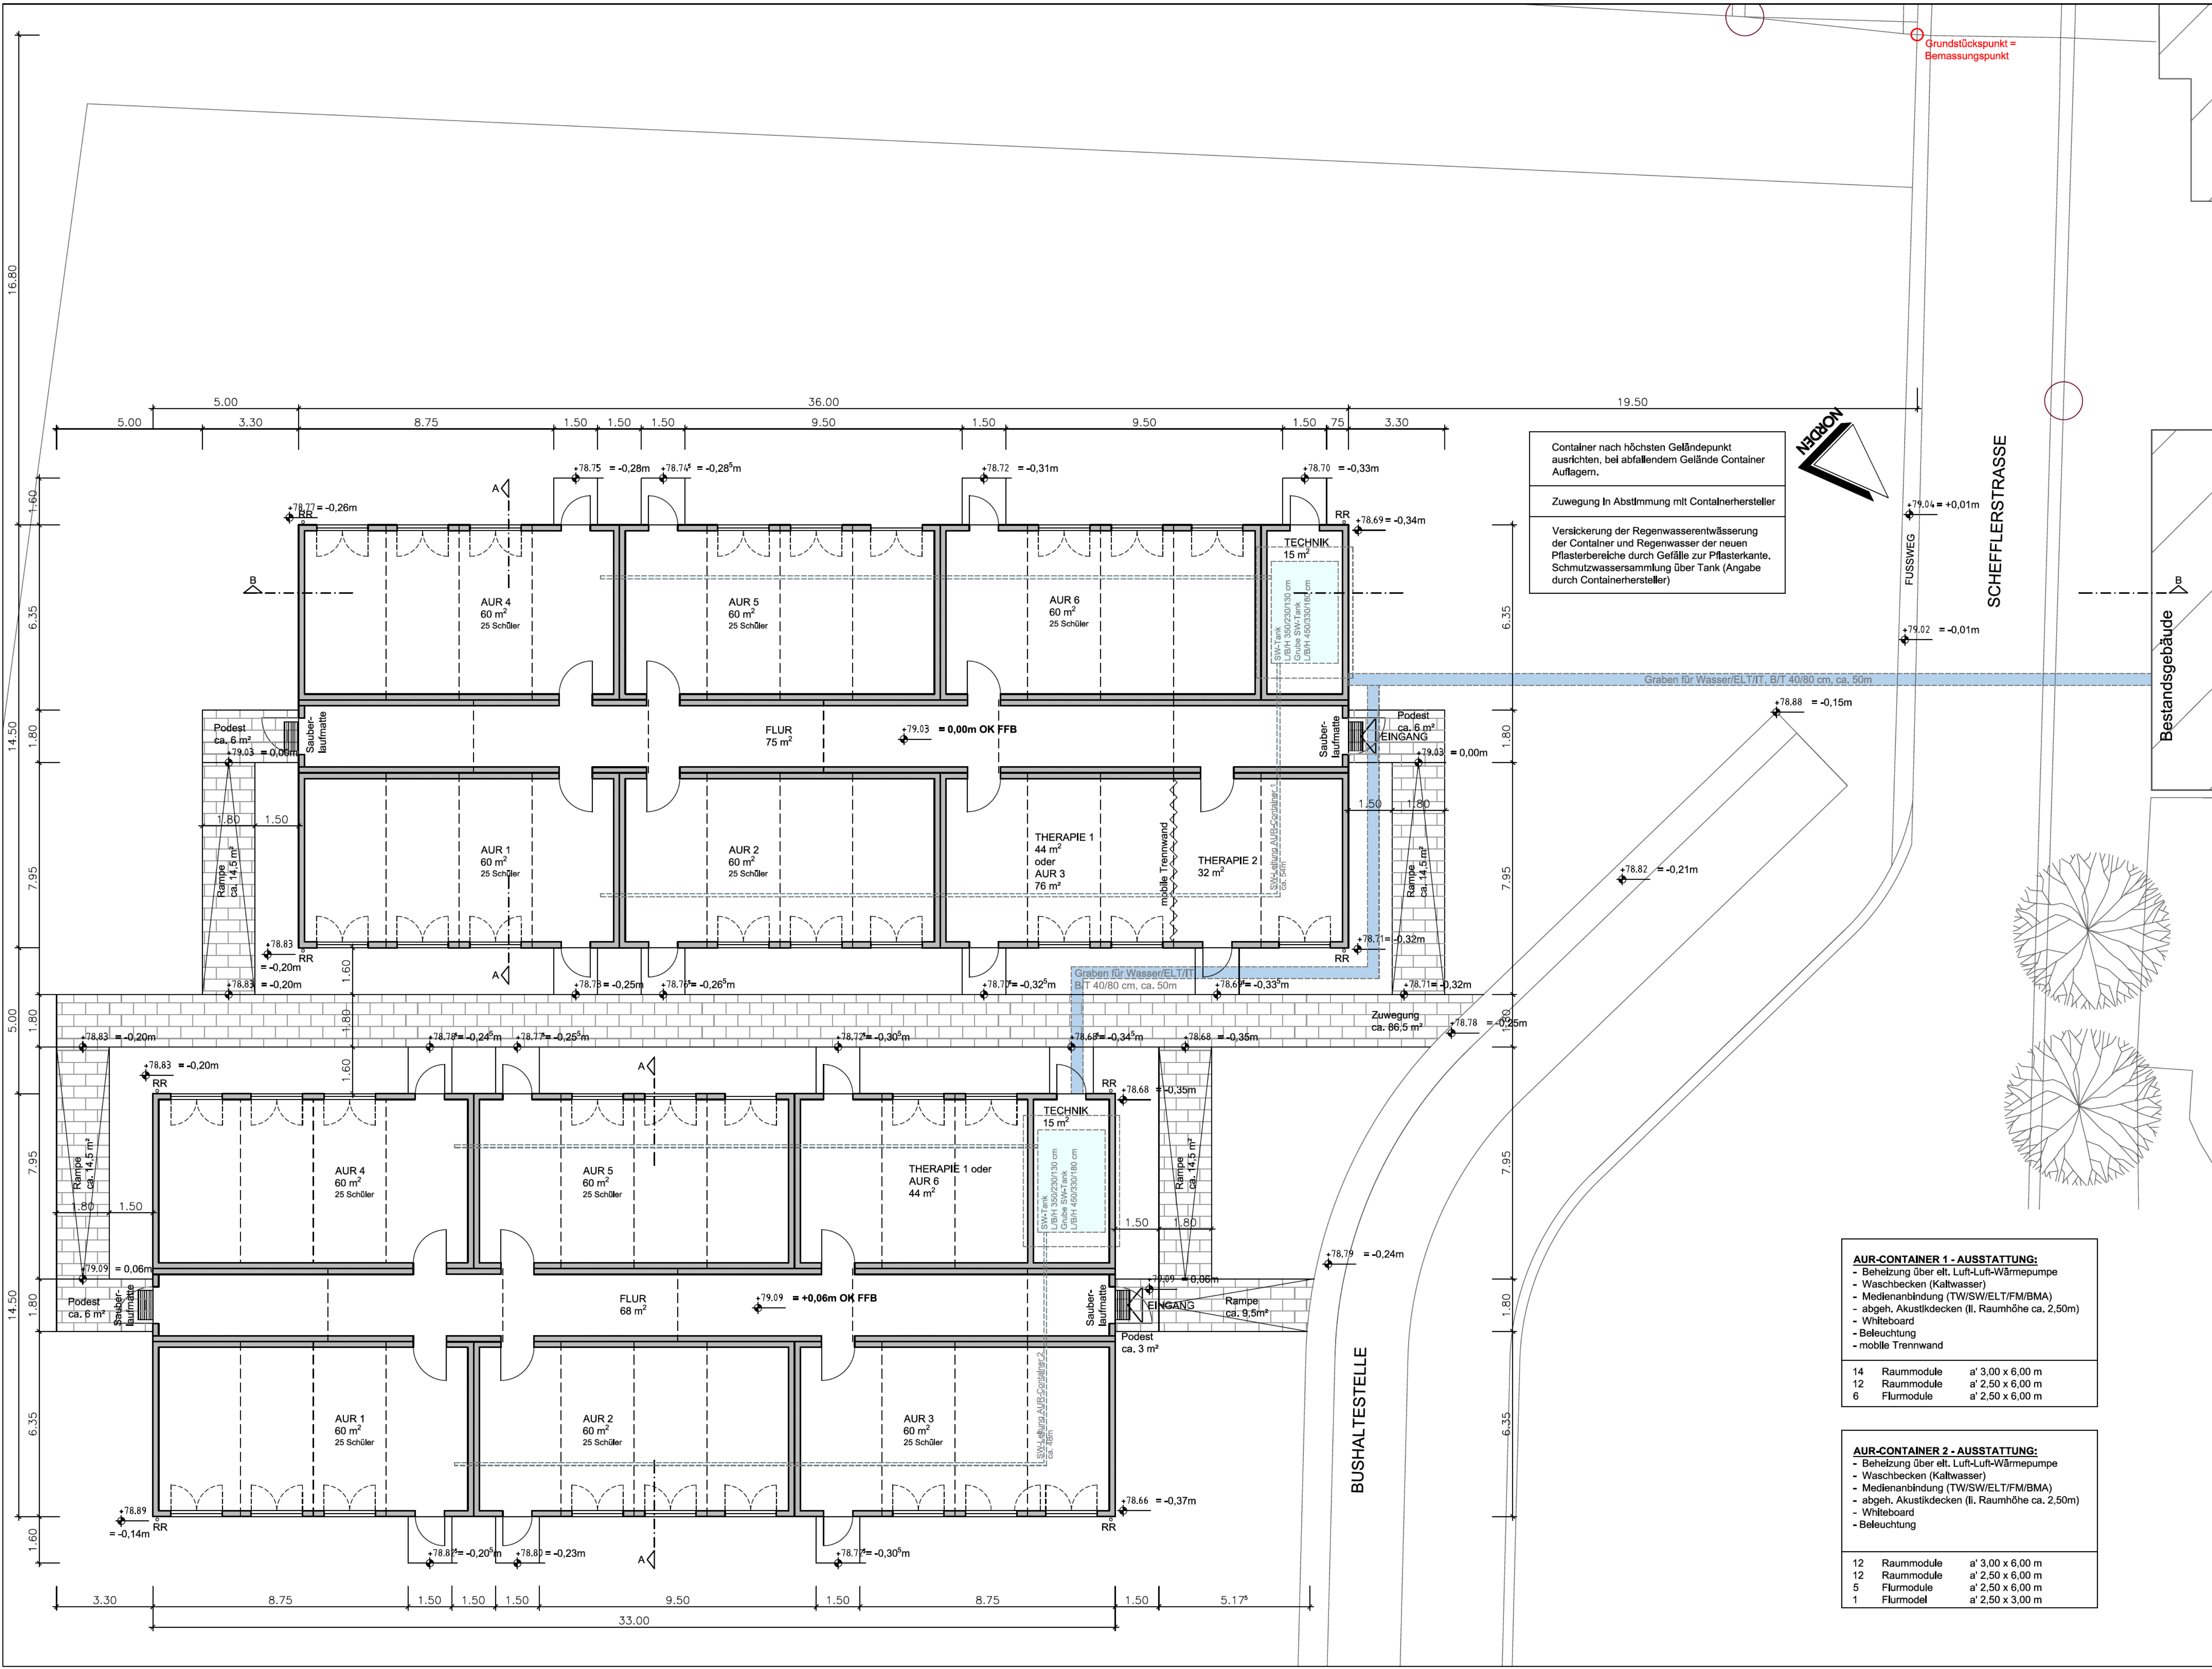

Container nach höchsten Geländepunkt ausrichten, bei abfallendem Gelände Container auflagern.

Zuwegung In Abstimmung mit Containerhersteller

Versickerung der Regenwasserentwässerung der Container und Regenwasser der neuen Pflasterbereiche durch Gefälle zur Pflasterkante. Schmutzwassersammlung über Tank (Angabe durch Containerhersteller)




SCHEFFLERSTRASSE

Bestandsgebäude

AUR-CONTAINER 1 - AUSSTATTUNG:			
- Beheizung über alt. Luft-Luft-Wärmepumpe			
- Waschbecken (Kaltwasser)			
- Medienanbindung (TW/SW/ELT/FM/BMA)			
- abgeh. Akustikdecken (II. Raumhöhe ca. 2,50m)			
- Whiteboard			
- Beleuchtung			
- mobile Trennwand			
14	Raummodule	a' 3,00 x 6,00 m	
12	Raummodule	a' 2,50 x 6,00 m	
6	Flurmodule	a' 2,50 x 6,00 m	

AUR-CONTAINER 2 - AUSSTATTUNG:			
- Beheizung über alt. Luft-Luft-Wärmepumpe			
- Waschbecken (Kaltwasser)			
- Medienanbindung (TW/SW/ELT/FM/BMA)			
- abgeh. Akustikdecken (II. Raumhöhe ca. 2,50m)			
- Whiteboard			
- Beleuchtung			
12	Raummodule	a' 3,00 x 6,00 m	
12	Raummodule	a' 2,50 x 6,00 m	
5	Flurmodule	a' 2,50 x 6,00 m	
1	Flurmodell	a' 2,50 x 3,00 m	

BAUVORHABEN
WE00395
FÖS HANS-WÜRTZ + GS BEBELHOF
BRANDSCHUTZSANIERUNG
KRUPPSTRASSE 24A · 38126 BRAUNSCHWEIG

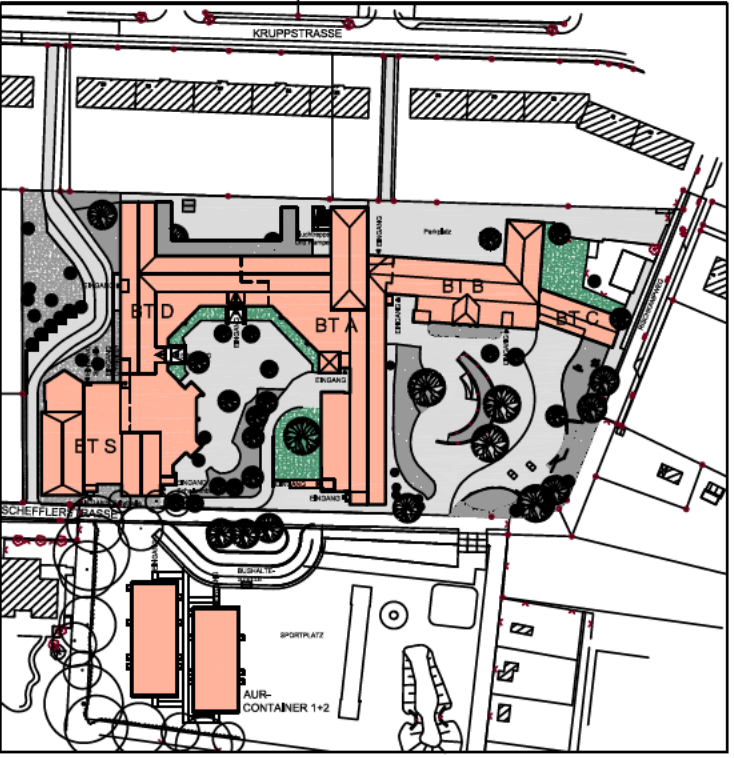

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN! DIE GEPRÜFTE STATIK IST ZU BEACHTEN!

BAUHERR
STADT BRAUNSCHWEIG
REFERAT HOCHBAU

WILLY-BRANDT-PLATZ 13
38102 BRAUNSCHWEIG

FACHINGENIEUR

PLANINHALT
AUR-CONTAINER 1+2
ZUWEGUNGSPLAN

MASZSTAB	PLANUNGSPHASE	DATUM	/ GEZ.	BLATTGRÖSSE	PLAN-NR. FACH-ING.	PLAN-NR. ARCHITEKT
1 : 100	AUSFÜHRUNG	13.04.2026	/ Jalaab	97/59		5-2021-6
