



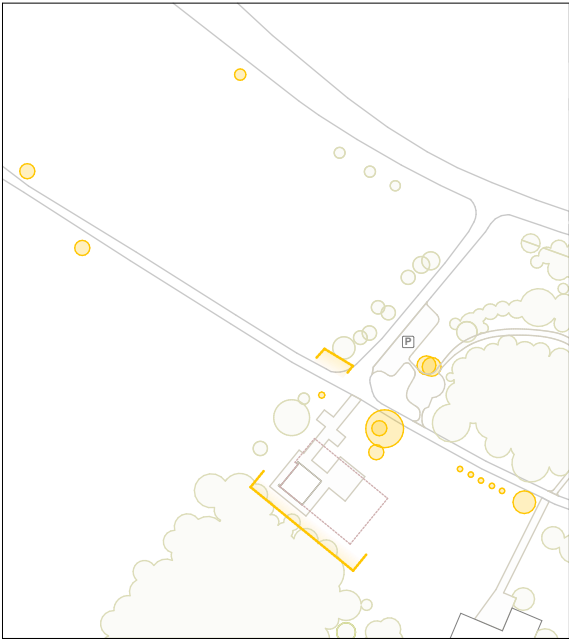

Feb 2026

Arbeitsvorbereitung: Fällen / Roden

Firma Baumfällung

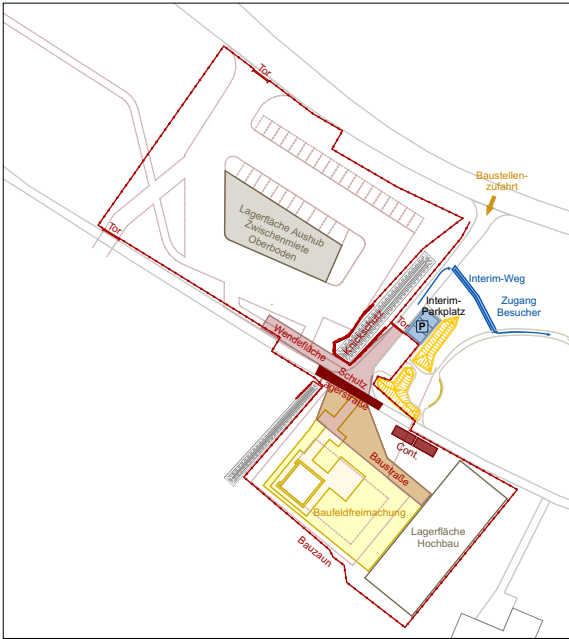

September 2026

BE / Baufeldfreimachung um Gebäude

AN Freianlagen:


- Bauzaun
- Baustraße (inkl. Schutz Lagerstraße)
- Sanitär-Container
- Abbruch Objekte der bestehende Freianlage
- Abtrag Oberboden / Deckschichten

AN ELT / HLS

- Baustrom / Bauwasser

AN Holzbau:

- Rückbau Fassadenschalung

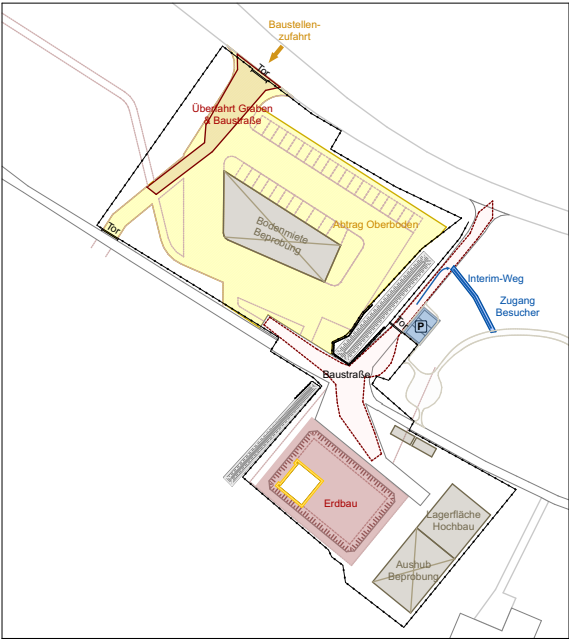

Oktober 2026

Baugrube / BA1 Abtrag Oberboden


AN Erd- u. Stahlbetonbau:

- Bodenaustausch
- Herstellen Baugrube u. Planum Hochbau

Begleitung durch Kampfmittelräumung

AN Freianlagen:

- Herstellen Überfahrt Graben
- Abtrag Oberboden Parkplatz

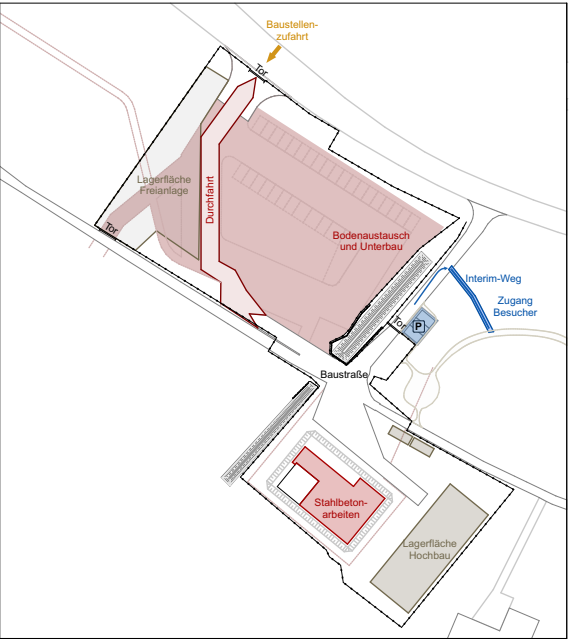

Oktober – Dezember 2026

Gründung Gebäude / BA1 Bodenaustausch


AN Erd- u. Stahlbetonbau:

- Gründung / Stahlbetonbauteile
- Verfüllen Baugrube

AN Freianlagen:

- Bodenaustausch und Unterbau Parkplatz

Begleitung durch Kampfmittelräumung

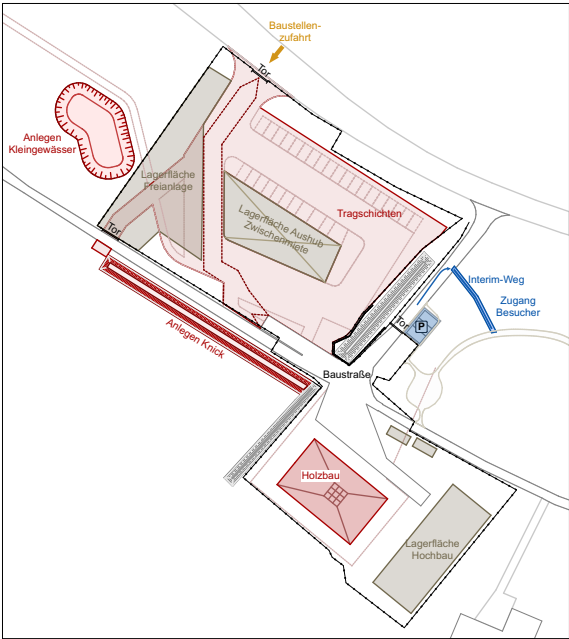

Januar – März 2027

Holzbau + Hülle Gebäude / BA1

AN Holzbau:


- Konstruktiver Holzbau Gebäude
- Fenster, Außentüren
- Dämmung, Unterspann- bzw. Unterdeckbahn

AN HLS:

- Bohrung Geothermie

AN Freianlagen:

- Tragschichten Parkplatz, Wege
- Erdmodellierung (Knick / Kleingewässer)

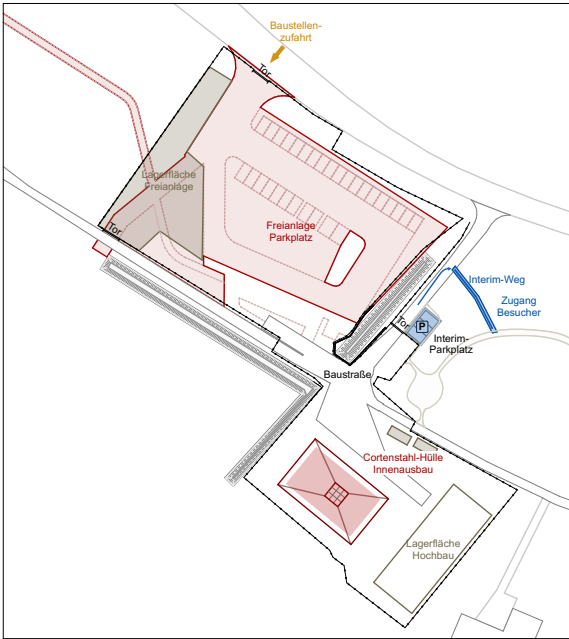

März – August 2027

Hülle + Innenausbau / BA1


Innenausbau Gebäude

AN Metallbau (Cortenstahl-Hülle):

- Dach
- Fassade
- Lieferleistungen für Freianlagen

AN Freianlagen:

- Parkplatz Deckschichten

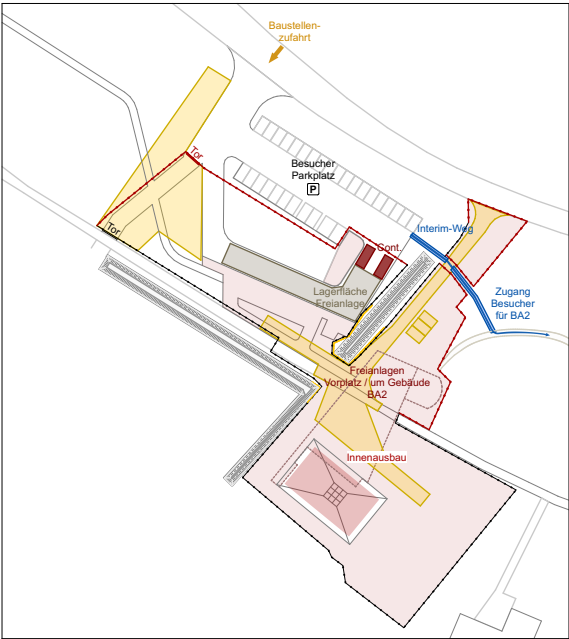

August – November 2027

Innenausbau / Freianlagen BA2

Fertigstellung Innenausbau Gebäude

AN Freianlagen:

- Pflasterarbeiten Wege, Bushalt
- Freianlagen Vorplatz WGD / um Gebäude
- Rückbau Baustraße & Wendefläche, Lagerflächen, best. Zufahrt und Interim-Pa
- Rückbau BE
- Wiederherstellen Geländeoberflächen
- Ansaaten / Pflanzarbeiten

Legende					
BRH	Brüstungshöhe	OK	Oberkante	H	Heizung
DD	Decken-/Dachdurchbruch	UK	Unterkante	L	Lüftung
BD	Bodendurchbruch	FFB	Fertigfußboden	S	Sanitär
WD	Wanddurchbruch	RB	Roßboden (Neubau)	ELT	Elektrotechnik
WS	Wandschlitz	BP	Bodenplatte	HK	Heizkörper
KB	Kernbohrung	rh	raumhoch	RR	Regenfallrohr
	Bestand		Stahlbeton		 BD
	Abbruch		Holzbauteile		 DD
	Neubau		Trockenbau		 WD
			Dämmung hart / weich		 WS
			Kies		

Hinweise

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Werk- und Detailplänen der Architekten, den Plänen der beteiligten Fachingenieure sowie den dazugehörigen statischen Berechnungen.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer zu prüfen. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung zu klären.

Wand- und Deckendurchbrüche, Kernbohrungen und Schlitz sind in Übereinstimmung mit den Plänen der Fachingenieure auszuführen.

Alle Brüstungs- und Türhöhen sind ab OKFF des jeweiligen Geschosses angegeben.

VORABZUG			
			Bezugshöhe ±0,00 = 22,07 m NHN
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearb.

Projekt		KZ-Gedenkstätte Schwesing Neubau Schulungs- und Veranstaltungsraum inkl. Freianlagen mit Stellplätzen	
Engelsburg 10 25813 Schwesing Flur 1 Gemarkung Schwesing			
Bauherr		Kreis Nordfriesland Marktstraße 6 25813 Husum	
Architekt		Schoener und Panzer Architekten BDA Dietzoldwerke Franz-Flemming-Str. 9 04179 Leipzig	
Status		Ausführungsplanung	
Inhalt		Baustellenlogistik Gesamtüberischt	
Maßstab		Format	
1:2000		DIN A3 297,0 x 420,0 mm	
Plandatum		Index	
10.07.2026		00	
