Bauzeitenplan #2533
Neubau Kita Hörnerkirchen
Stand: 24.07.2026
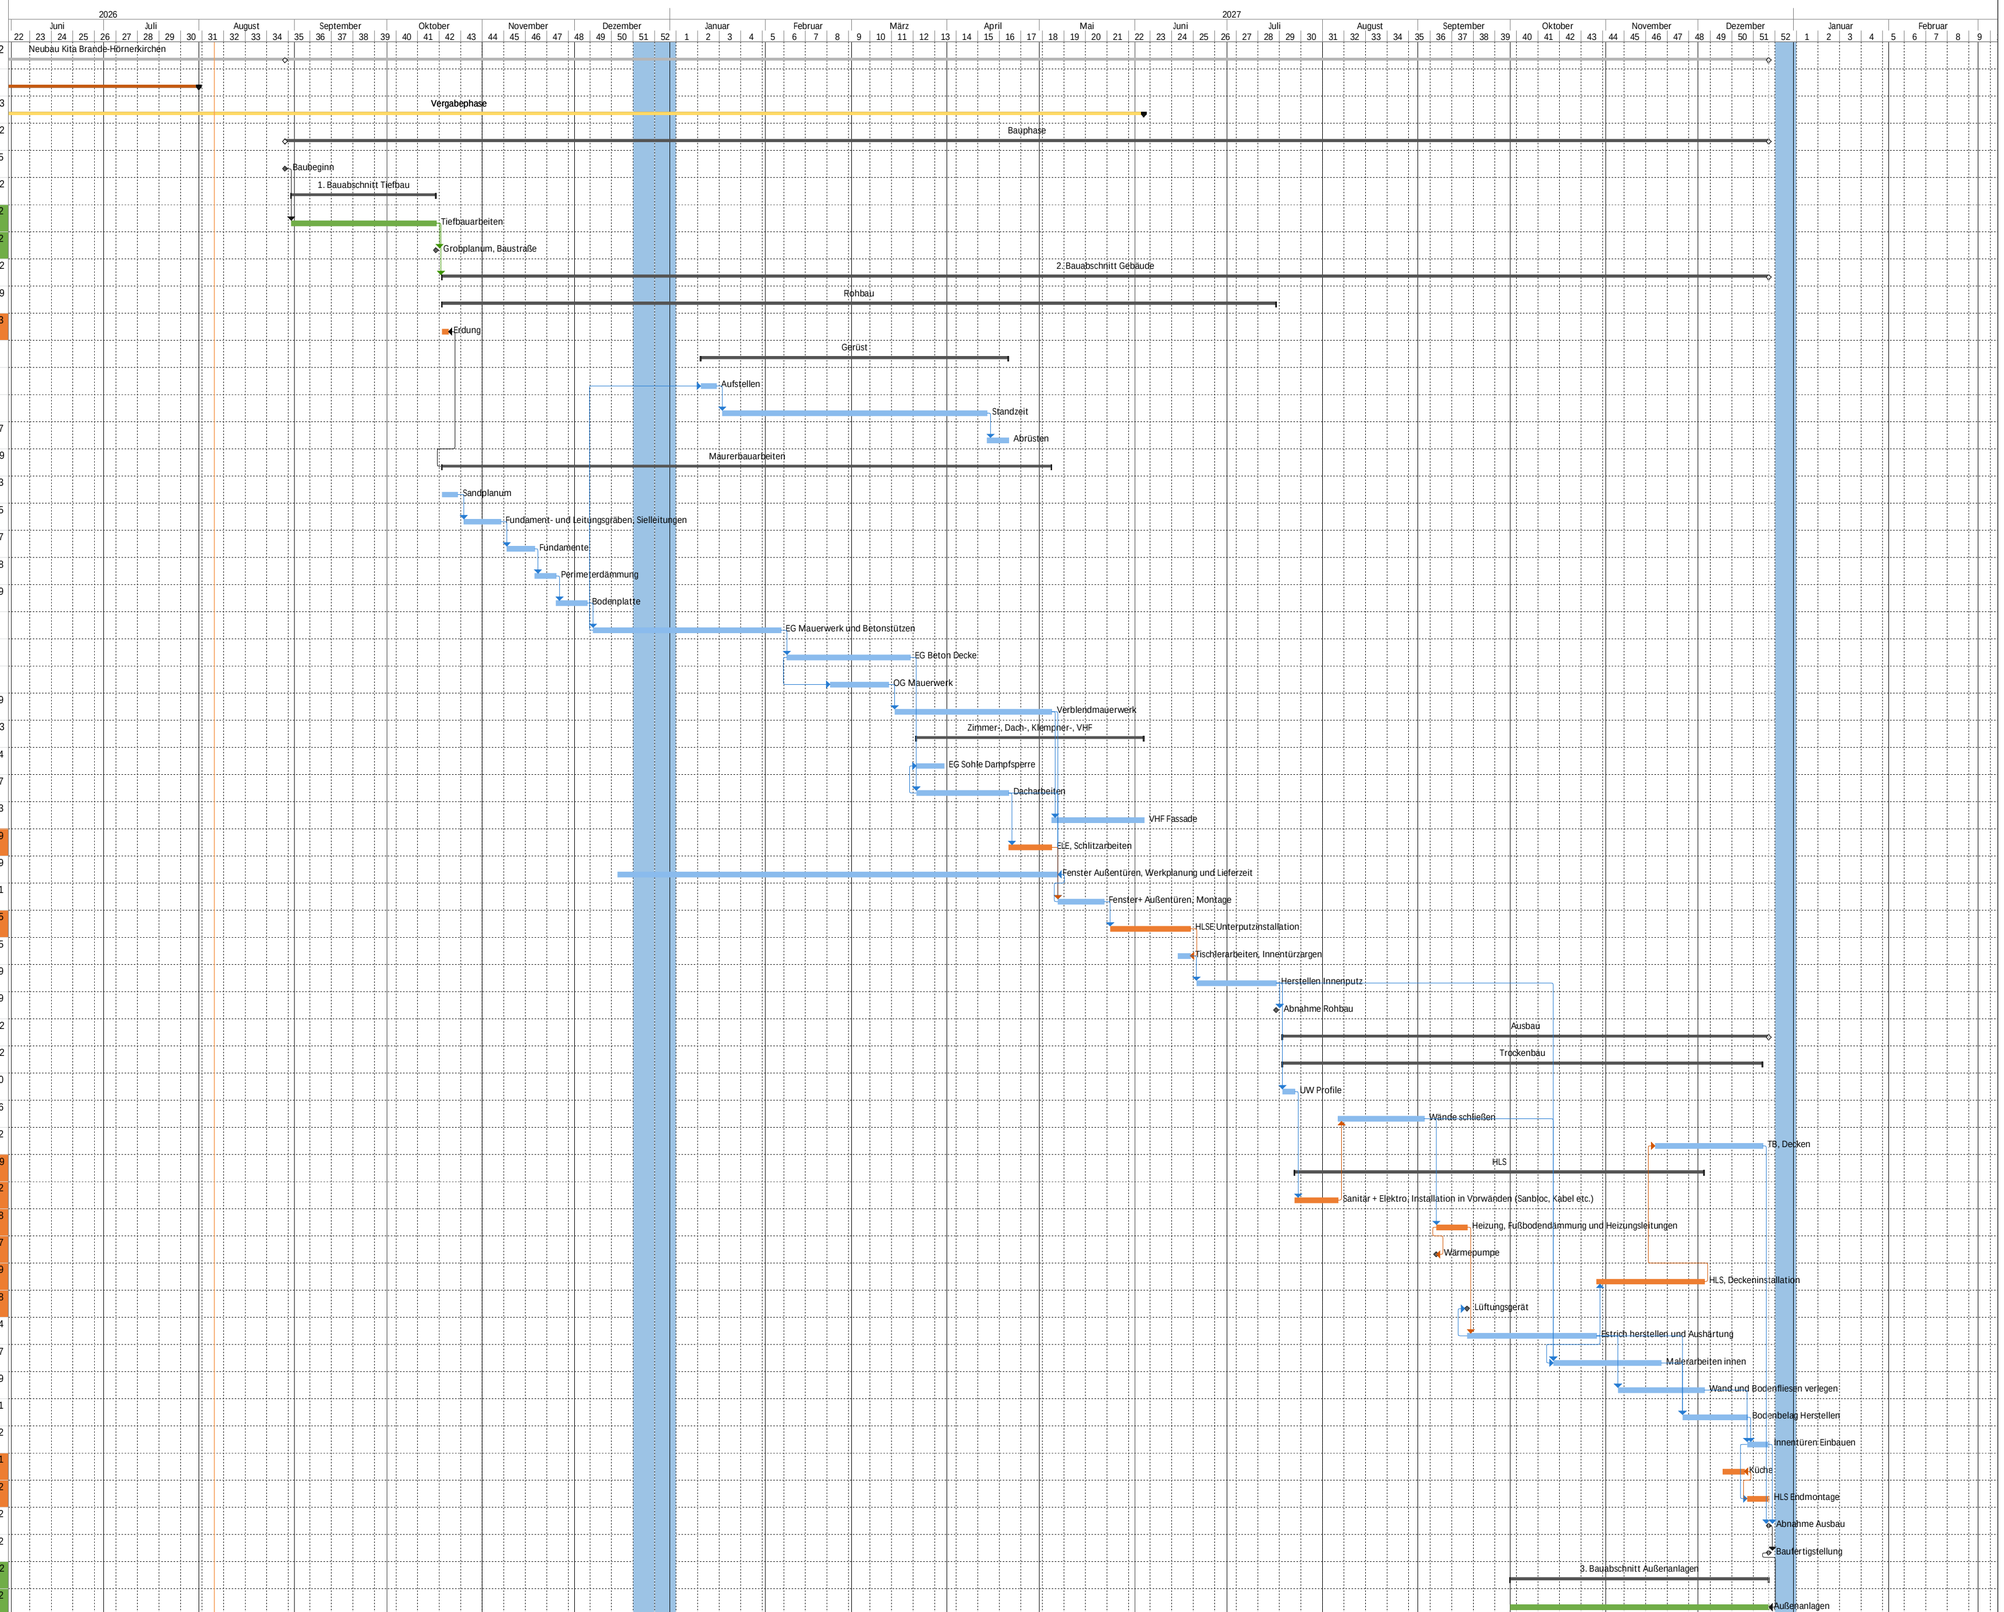
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Zeitraum KW
0	Neubau Kita Brande-Hörnerkirchen	740t	KW 1 - KW 52
1	Planungsphase	390t	KW 1 - KW 31
43	Vergabephase	300t	KW 12 - KW 23
104	Bauphase	330t	KW 35 - KW 52
105	Baubeginn	0t	KW 35 - KW 35
106	1. Bauabschnitt Tiefbau	35t	KW 36 - KW 42
107	Tiefbauarbeiten	35t	KW 36 - KW 42
108	Grobplanum, Baustraße	0t	KW 42 - KW 42
109	2. Bauabschnitt Gebäude	295t	KW 43 - KW 52
110	Rohbau	181t	KW 43 - KW 29
111	Erdung	2t	KW 43 - KW 43
112	Gerüst	70t	KW 3 - KW 17
113	Aufstellen	5t	KW 3 - KW 3
114	Standzeit	60t	KW 4 - KW 16
115	Abrüsten	5t	KW 16 - KW 17
116	Maurerbauarbeiten	130t	KW 43 - KW 19
117	Sandplanum	5t	KW 43 - KW 43
118	Fundament- und Leitungsgräben, Sielleitungen	10t	KW 44 - KW 45
119	Fundamente	7t	KW 46 - KW 47
120	Perimeterdämmung	5t	KW 47 - KW 48
121	Bodenplatte	8t	KW 48 - KW 49
122	EG Mauerwerk und Betonstützen	35t	KW 50 - KW 6
123	EG Beton Decke	30t	KW 7 - KW 12
124	OG Mauerwerk	15t	KW 9 - KW 11
125	Verblendmauerwerk	35t	KW 12 - KW 19
126	Zimmer-, Dach-, Klempner-, VHF	50t	KW 13 - KW 23
127	EG Sohle Dampfsperre	5t	KW 13 - KW 14
128	Dacharbeiten	20t	KW 13 - KW 17
129	VHF Fassade	20t	KW 19 - KW 23
130	ELE, Schlitzarbeiten	10t	KW 17 - KW 19
131	Fenster Außentüren, Werkplanung und Lieferzeit	90t	KW 51 - KW 19
132	Fenster+ Außentüren, Montage	10t	KW 19 - KW 21
133	HLSE Unterputzinstallation	20t	KW 22 - KW 25
134	Tischlerarbeiten, Innentürzargen	4t	KW 25 - KW 25
135	Herstellen Innenputz	20t	KW 26 - KW 29
136	Abnahme Rohbau	0t	KW 29 - KW 29
137	Ausbau	114t	KW 30 - KW 52
138	Trockenbau	112t	KW 30 - KW 52
139	UW Profile	4t	KW 30 - KW 30
140	Wände schließen	20t	KW 32 - KW 36
141	TB, Decken	25t	KW 47 - KW 52
142	HLS	95t	KW 30 - KW 49
143	Sanitär + Elektro, Installation in Vorwänden (Sanbloc, Kabel etc.)	10t	KW 30 - KW 32
144	Heizung, Fußbodendämmung und Heizungsleitungen	8t	KW 37 - KW 38
145	Wärmepumpe	0t	KW 37 - KW 37
146	HLS, Deckeninstallation	25t	KW 44 - KW 49
147	Lüftungsgerät	0t	KW 38 - KW 38
148	Estrich herstellen und Aushärtung	30t	KW 38 - KW 44
149	Malerarbeiten innen	25t	KW 42 - KW 47
150	Wand und Bodenfliesen verlegen	20t	KW 45 - KW 49
151	Bodenbelag Herstellen	15t	KW 48 - KW 51
152	Innentüren Einbauen	5t	KW 51 - KW 52
153	Küche	5t	KW 50 - KW 51
154	HLS Endmontage	5t	KW 51 - KW 52
155	Abnahme Ausbau	0t	KW 52 - KW 52
156	Baufertigstellung	0t	KW 52 - KW 52
157	3. Bauabschnitt Außenanlagen	60t	KW 40 - KW 52
158	Außenanlagen	60t	KW 40 - KW 52
