
Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Ressourcennamen
0		**ZVO Neustadt; Brandschutzertuechtigung - Gesamtterminplan**	**521 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Don 24.06.27**			
1		**Planung**	**521 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Don 24.06.27**			
2		Entwurfsplanung	0 Tage	Mon 16.06.25	Mon 16.06.25		3	
3		Brandschutz	45 Tage	Mon 20.10.25	Fre 19.12.25	2	4	
4		Genehmigungsplanung	55 Tage	Mon 22.12.25	Fre 06.03.26	3	5	
5		Genehmigungsstatik	40 Tage	Mon 09.03.26	Fre 01.05.26	4	6	
6		Einreichung Bauantrag	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26	5	7	
7		Genehmigungsverfahren Baugenehmigung	60 Tage	Mon 11.05.26	Fre 31.07.26	6	8	
8		Prüfstatiker	30 Tage	Mon 03.08.26	Fre 11.09.26	7	9	
9		Schal- und Bewehrungspläne	30 Tage	Mon 14.09.26	Fre 23.10.26	8	23	
10		Planungsbereit	0 Tage	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26		14;45;70;90;106	
11		Revision 2027	17 Tage	Mon 24.05.27	Die 15.06.27		63AA;41AA;62AA	
12		**Los 2 GU Bau**	**222 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 18.06.27**			
13		**Ausschreibung**	**80 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 20.11.26**			
14		ZVO Durchsicht Unterlagen	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	10	15	
15		FBI Überarbeitung Unterlagen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	14	16	
16		ZVO Vergabestelle	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	15	18;17	
17		Veröffentlichung Ausschreibun	0 Tage	Fre 11.09.26	Fre 11.09.26	16		
18		Angebotsphase Tief- und Rohbau	30 Tage	Mon 14.09.26	Fre 23.10.26	16	19	
19		Vergabe GU-Bau	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	18	21	
20		**Pumpenhaus und Behälter**	**95 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Mit 14.04.27**			
21		Mobilisierung	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	19	22	
22		Rückbau/Baufeldfreimachung Pumpenhaus/Behälter	5 Tage	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	21	23;30	
23		Tiefgründung Pumpenhaus	10 Tage	Mon 21.12.26	Don 14.01.27	22;9;24AE	26;32	
24		Tiefgründung Löschwasserbehälter	10 Tage	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	31EE	25;32;26;23AE	
25		Bodenplatte Löschwasserbehälter	10 Tage	Don 28.01.27	Mit 10.02.27	24	26	
26		Rohbau (Sohle Wände Dach) Pumpenhaus	20 Tage	Don 11.02.27	Mit 10.03.27	23;24;25	27	
27		erw. Rohbau Pumpenhaus	15 Tage	Don 11.03.27	Mit 31.03.27	26	28	
28		Ausbau Pumpenhaus	10 Tage	Don 01.04.27	Mit 14.04.27	27	61;117;42;101	
29		**Löschzentrale**	**75 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Mit 07.04.27**			
30		Rückbau/Baufeldfreimachung Löschzentrale	15 Tage	Mon 14.12.26	Mit 13.01.27	22	32;37;31	
31		Grundleitungen und Schacht	10 Tage	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	30	32;24EE	
32		Tiefgründung Löschzentrale	5 Tage	Don 28.01.27	Mit 03.02.27	30;23;24;31	33	
33		Rohbau (Sohle Wände Dach) Löschzentrale	20 Tage	Don 04.02.27	Mit 03.03.27	32	34	
34		erw. Rohbau Löschzentrale	15 Tage	Don 04.03.27	Mit 24.03.27	33	35	
35		Ausbau Löschzentrale	10 Tage	Don 25.03.27	Mit 07.04.27	34	60;116;42;100	
36		**Inertisierung**	**45 Tage**	**Don 14.01.27**	**Mit 17.03.27**			
37		Rückbau/Baufeldfreimachung Gaslöschlager	10 Tage	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	30	38	
38		Entwässerung in Sole herstellen	5 Tage	Don 28.01.27	Mit 03.02.27	37	39	
39		Rohbau (Wände Dach) Gaslöschlager	15 Tage	Don 04.02.27	Mit 24.02.27	38	40	
40		Erweiterter Rohbau/Ausbau Gaslöschlager	15 Tage	Don 25.02.27	Mit 17.03.27	39	102;118;42;84	
41		Außenanlagen/Pflaster	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	11AA	42	
42		Abnahme Gewerk	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	35;40;41;28		
43		**Los 1 Bunkerlöschanlage**	**226 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Don 24.06.27**			
44		**Ausschreibung**	**75 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 13.11.26**			
45		ZVO Durchsicht Unterlagen	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	10	46	
46		FBI Überarbeitung Unterlagen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	45	47	
47		ZVO Vergabestelle	2 Tage	Mon 31.08.26	Die 01.09.26	46	49;48	
48		Veröffentlichung Ausschreibung	0 Tage	Die 01.09.26	Die 01.09.26	47		
49		Angebotsphase Bunkerlöschanlage	25 Tage	Mit 02.09.26	Die 06.10.26	47	51;50	
50		Submission	0 Tage	Die 06.10.26	Die 06.10.26	49		
51		Prüfung Angebote	27 Tage	Mit 07.10.26	Don 12.11.26	49	52;52	
52		Vergabe	0 Tage	Don 12.11.26	Don 12.11.26	51		
53		Ende Bindefrist	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26	51	55	
54		**Ausführung**	**151 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Don 24.06.27**			
55		Mobilisierung	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	53	56	
56		Werksplanung Löschtechnik	30 Tage	Mon 23.11.26	Mit 13.01.27	55	57	
57		Prüfung Planung Löschtechnik (GP)	10 Tage	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	56	58;59	
58		Fertigung Löschtechnik Bunker	60 Tage	Don 28.01.27	Mit 21.04.27	57	63;62	
59		Fertigung Löschtechnik Zentrale und Pumpenhaus	60 Tage	Don 28.01.27	Mit 21.04.27	57	60EA-10 Tage;62;61EA-10 Tage	
60		Einbau Löschtechnik Löschzentrale	30 Tage	Don 08.04.27	Mit 19.05.27	59EA-10 Tage;35		
61		Einbau Löschtechnik Pumpenhaus	30 Tage	Don 15.04.27	Mit 26.05.27	59EA-10 Tage;28		
62		Brandschutzertüchtigung der Abklappstellen	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27	58;59;11AA	65	
63		Einbau Löschtechnik Bunker	17 Tage	Mon 24.05.27	Die 15.06.27	58;11AA	64EE-5 Tage	
64		VDS Sichtabnahme Bunkerlöschanlage	0 Tage	Die 08.06.27	Die 08.06.27	63EE-5 Tage	65EA+2 Tage	
65		Funktionsprüfung Bunkerlöschanlage	0 Tage	Don 10.06.27	Don 10.06.27	64EA+2 Tage;103;116;117;62	66	
66		VDS Abnahme	5 Tage	Fre 11.06.27	Don 17.06.27	65	67	
67		Abnahme Gewerk	5 Tage	Fre 18.06.27	Don 24.06.27	66		
68		**Los 4 Inertisierung**	**201 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Don 20.05.27**			
69		**Ausschreibung**	**75 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 13.11.26**			
70		ZVO Durchsicht Unterlagen	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	10	71	
71		FBI Überarbeitung Unterlagen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	70	72	
72		ZVO Vergabestelle	2 Tage	Mon 31.08.26	Die 01.09.26	71	74;73	
73		Veröffentlichung Ausschreibung	0 Tage	Die 01.09.26	Die 01.09.26	72		
74		Angebotsphase Inertgaslöschanlage	25 Tage	Mit 02.09.26	Die 06.10.26	72	76;75	
75		Submission	0 Tage	Die 06.10.26	Die 06.10.26	74		
76		Prüfung Angebote	27 Tage	Mit 07.10.26	Don 12.11.26	74	77	
77		Vergabe	0 Tage	Don 12.11.26	Don 12.11.26	76	78;80	
78		Ende Bindefrist	1 Tag	Fre 13.11.26	Fre 13.11.26	77		
79		**Ausführung**	**127 Tage**	**Fre 13.11.26**	**Don 20.05.27**			
80		Mobilisierung	5 Tage	Fre 13.11.26	Don 19.11.26	77	81	
81		Werksplanung	30 Tage	Fre 20.11.26	Die 12.01.27	80	82	
82		Prüfung	10 Tage	Mit 13.01.27	Die 26.01.27	81	83	
83		Fertigung	50 Tage	Mit 27.01.27	Die 06.04.27	82	84	
84		Einbau Löschtechnik Trafo- und MSHV-Raum	20 Tage	Mit 07.04.27	Die 04.05.27	83;40	85	
85		Sichtabnahme	0 Tage	Die 04.05.27	Die 04.05.27	84;118;102	86EA+2 Tage	
86		VDS Abnahme	5 Tage	Fre 07.05.27	Don 13.05.27	85EA+2 Tage	87	
87		Abnahme Gewerk	5 Tage	Fre 14.05.27	Don 20.05.27	86		
88		**Los 3 Ausschreibung TGA (HLKS)**	**195 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Mit 12.05.27**			
89		**Ausschreibung**	**80 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 20.11.26**			
90		ZVO Durchsicht Unterlagen	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	10	91	
91		FBI Überarbeitung Unterlagen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	90	92	
92		ZVO Vergabestelle	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	91	93	
93		Angebotsphase TGA (HLKS)	30 Tage	Mon 14.09.26	Fre 23.10.26	92	94	
94		Vergabe TGA (HLKS)	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	93	96	
95		**Ausführung**	**115 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Mit 12.05.27**			
96		Mobilisierung	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	94	97	
97		Werksplanung	30 Tage	Mon 30.11.26	Mit 20.01.27	96	98	
98		Prüfung	10 Tage	Don 21.01.27	Mit 03.02.27	97	99	
99		Fertigung	30 Tage	Don 04.02.27	Mit 17.03.27	98	100;101;102	
100		Ausführung HLKS Löschzentrale	15 Tage	Don 08.04.27	Mit 28.04.27	99;35	103	
101		Ausführung HLKS Pumpenhaus	15 Tage	Don 15.04.27	Mit 05.05.27	99;28	103	
102		Ausführung HLKS Intertisierung	15 Tage	Don 18.03.27	Mit 07.04.27	40;99	85	
103		Abnahme Gewerk	5 Tage	Don 06.05.27	Mit 12.05.27	100;101	65	
104		**Los 5 (E-MSR)**	**205 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Mit 26.05.27**			
105		**Ausschreibung**	**80 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 20.11.26**			
106		ZVO Durchsicht Unterlagen	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	10	107	
107		FBI Überarbeitung Unterlagen	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	106	108	
108		ZVO Vergabestelle	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	107	109	
109		Angebotsphase TGA (E-MSR)	30 Tage	Mon 14.09.26	Fre 23.10.26	108	110	
110		Vergabe TGA (E-MSR)	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	109	112	
111		**Ausführung**	**125 Tage**	**Mon 23.11.26**	**Mit 26.05.27**			
112		Mobilisierung	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	110	113	
113		Werksplanung	30 Tage	Mon 30.11.26	Mit 20.01.27	112	114	
114		Prüfung	10 Tage	Don 21.01.27	Mit 03.02.27	113	115	
115		Fertigung	30 Tage	Don 04.02.27	Mit 17.03.27	114	116;117;118	
116		Ausführung E-MSR Löschzentrale	30 Tage	Don 08.04.27	Mit 19.05.27	115;35	65;119	
117		Ausführung E-MSR Pumpenhaus	15 Tage	Don 15.04.27	Mit 05.05.27	115;28	65;119	
118		Ausführung E-MSR Intertisierung	15 Tage	Don 18.03.27	Mit 07.04.27	115;40	85;119	
119		Abnahme Gewerk	5 Tage	Don 20.05.27	Mit 26.05.27	118;117;116		

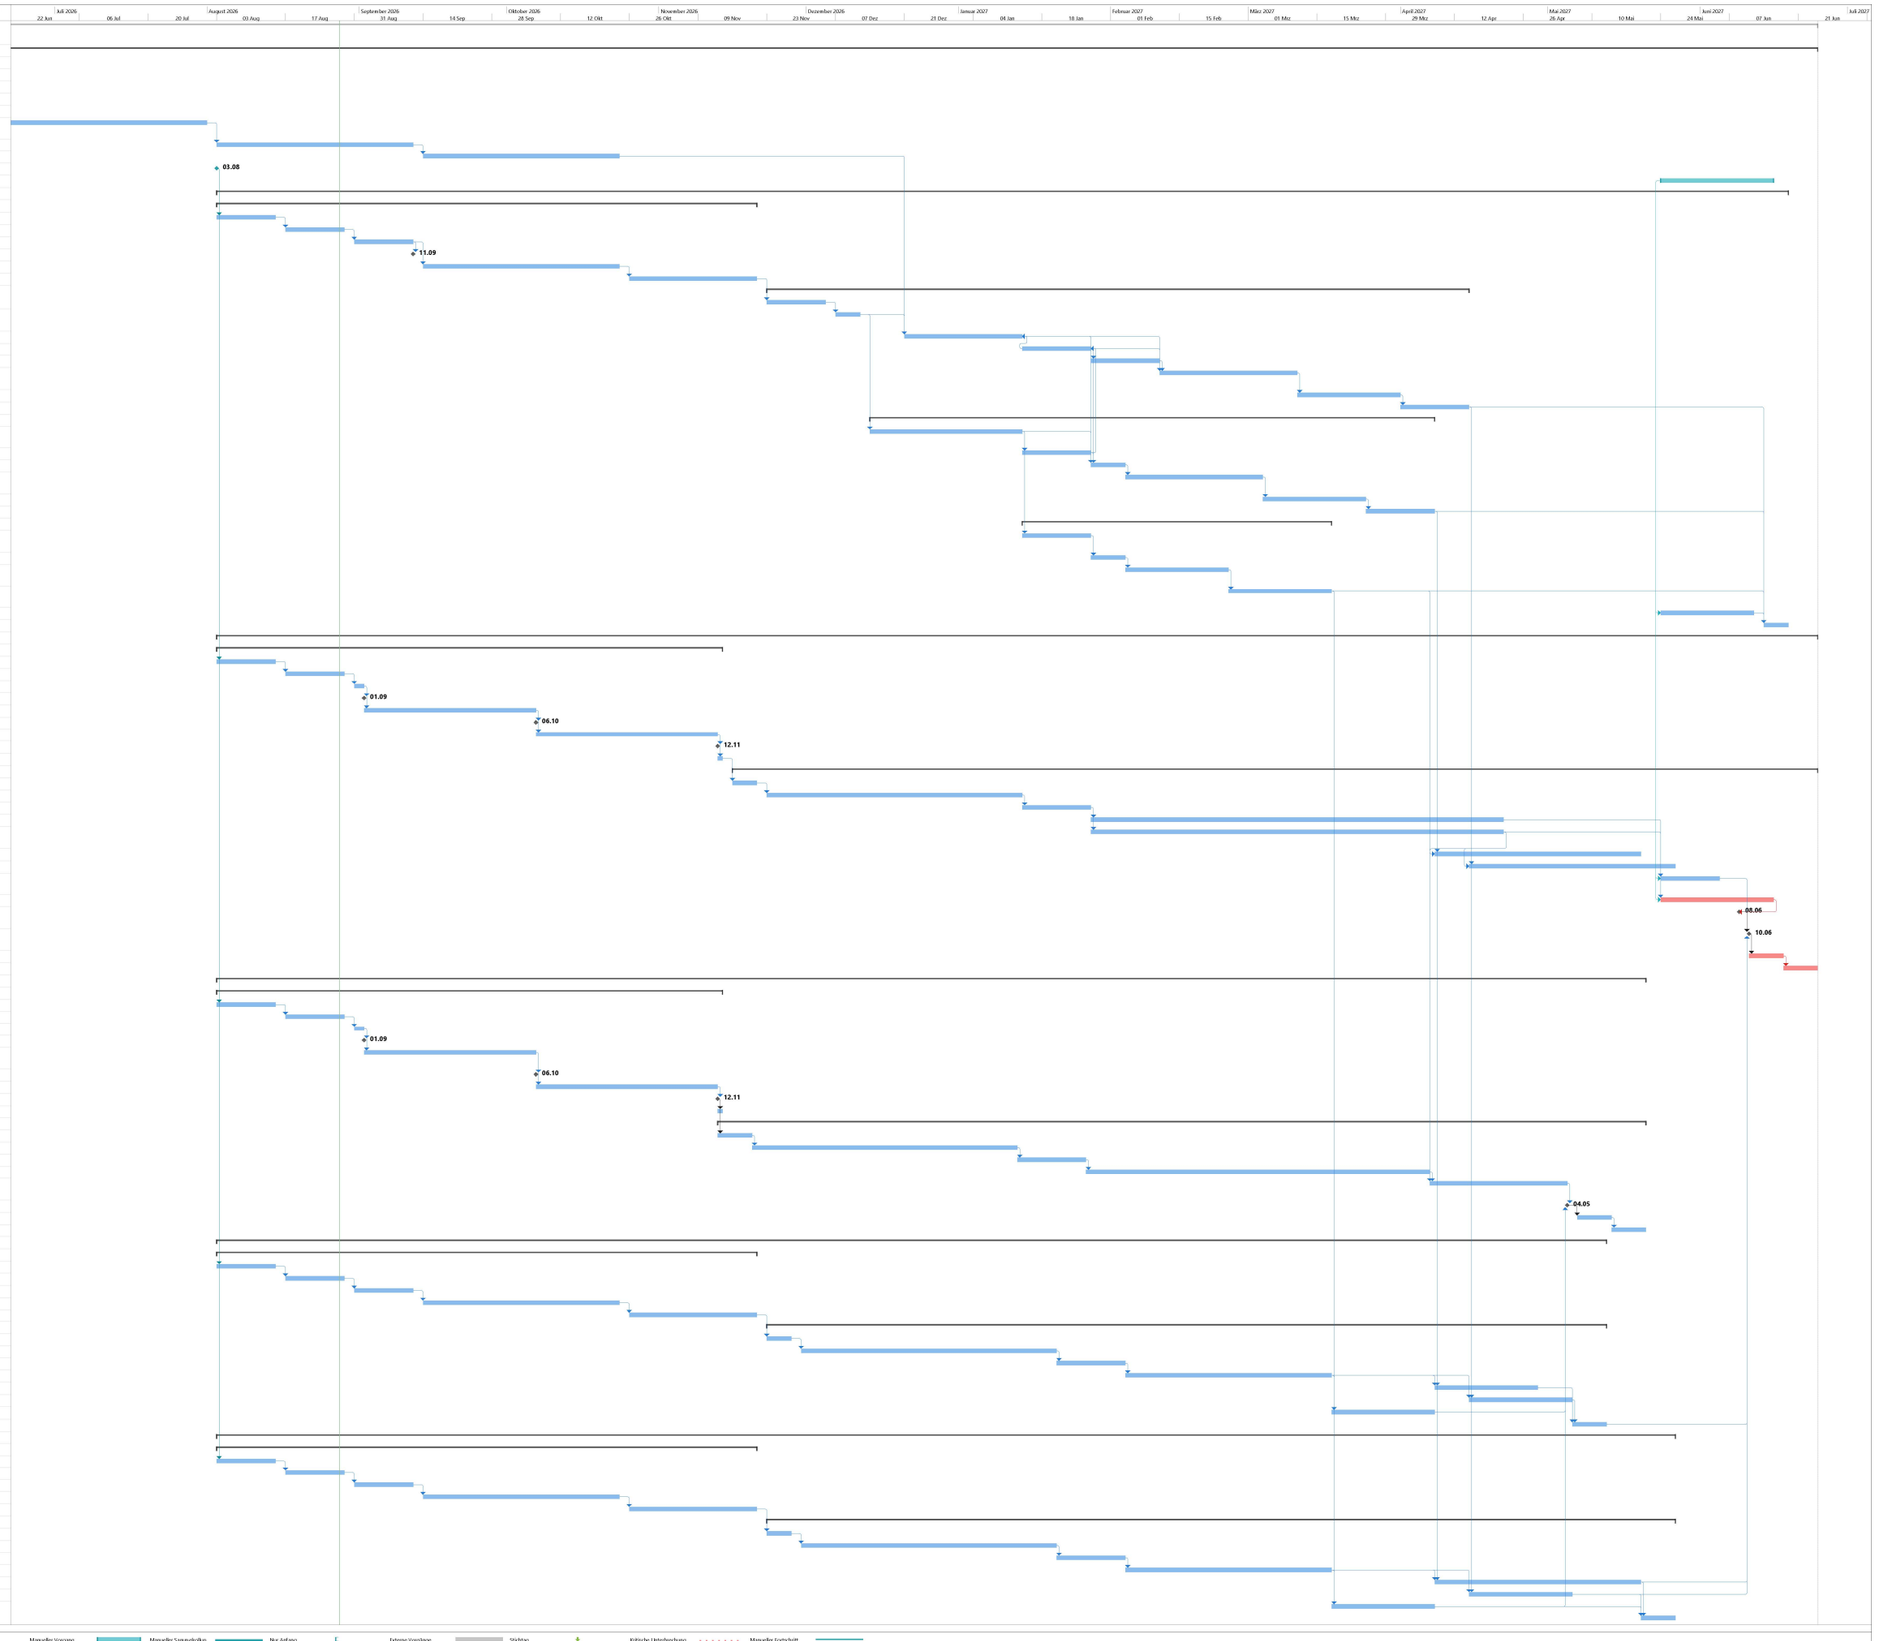

Projekt: ZVO Neustadt; Brands
Datum: Fre 28.08.26

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelvorgkp · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Kritische Unterbrechung · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · Kritisch · In Arbeit
