
Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen
0		**2023_363_2026_03_31_Bauzeitenplan**	**631 Tage**	**Di 15.12.26**	**Di 15.05.29**		
1		**Hydraulisches Gewerk**	**631 Tage**	**Di 15.12.26**	**Di 15.05.29**		
2		Submission	1 Tag	Di 15.12.26	Di 15.12.26		hydraulisches Gewerk
3		Vergabe	36 Tage	Fr 18.12.26	Fr 05.02.27	2	hydraulisches Gewerk
4		Baustelleneinweisung	1 Tag	Mo 15.02.27	Mo 15.02.27	3EA+5 Tage	hydraulisches Gewerk
5		Wekplanung	70 Tage	Fr 19.02.27	Do 27.05.27	4	hydraulisches Gewerk
6		Vorab-Austausch Klappe DN 800	3 Tage	Di 16.03.27	Do 18.03.27		hydraulisches Gewerk
7		Vorlage der Werkplanung (Aufbereitung)	1 Tag	Fr 28.05.27	Fr 28.05.27	5	hydraulisches Gewerk
8		Prüfen und Freigeben der Werkplanung (Aufbereitung)	4 Wochen	Mo 31.05.27	Fr 25.06.27	7	örtliche BÜ
9		Baustelleneinrichtung	2 Wochen	Mo 28.06.27	Fr 09.07.27	8	hydraulisches Gewerk
10		vollständiges Freiräumen bestehender Leerplatz Filterstraße (BA 1)	5 Tage	Mo 12.07.27	Fr 16.07.27	9	hydraulisches Gewerk
11		Außerbetriebnahme Tiefbrunnen-Zulauf; Erneuerung Tiefbrunnen-Zuläufe u. anteilig Rohwassersammelleitung (BA 2)	5 Tage	Mo 19.07.27	Fr 23.07.27	10	hydraulisches Gewerk
12		Erneuerung Flachbrunnen-Zulauf (BA 3)	2 Tage	Mo 26.07.27	Di 27.07.27	11	
13		Provisorische Umverlegung Rohwasserbeschickung Filtergruppe 3 (BA 4)	1 Woche	Mi 28.07.27	Di 03.08.27	12	hydraulisches Gewerk
14		Aufstellung 3 St. neue Filterbehälter bei best. Filterstraßen-Leerplatz (BA 4)	2 Wochen	Mi 01.09.27	Di 14.09.27	13EA+20 Tage	hydraulisches Gewerk
15		Abrüstung best. Filtergruppe 1 ; Demontage Filterbehälter u. Oxidatoren, inkl. Anschlussberohrung; prov. Verschluss relevanter Leitungen zur Filtergruppe 2 (BA 5)	3 Wochen	Mi 15.09.27	Di 05.10.27	14	hydraulisches Gewerk
16		Provisorische Umverlegung Rohwasserbeschickung Filtergruppe 2 (BA 5)	1 Woche	Mi 06.10.27	Di 12.10.27	15	hydraulisches Gewerk
17		Aufstellung weiterer 3 St. neuer Filterbehälter (BA 6)	2 Wochen	Mi 03.11.27	Di 16.11.27	16EA+15 Tage	hydraulisches Gewerk
18		vollständige hydraulische Ausrüstung (Grobmontage) des neuen Anlagenteils bzw. der 6 St. neuen Filter; Errichtung der Metallbaukonstruktionen (BA 7)	14 Wochen	Mi 17.11.27	Di 22.02.28	17	hydraulisches Gewerk
19		provisorische Aufstellung u. Installation der Steuerluft und der Spülluft der Neuanlage; prov. Einbindung der Neuanlage für möglichen Parallelbetrieb mit Altbestand (BA 8)	5 Wochen	Mi 23.02.28	Di 28.03.28	18	hydraulisches Gewerk
20		Endmontage (Klein- und Schlauchleitungen Messungen u. Pneumatik) der neuen Aufbereitungsanlage (BA 8)	10 Wochen	Mi 29.03.28	Di 06.06.28	19	hydraulisches Gewerk
21		Funktionstests u. Inbetriebnahme Neuanlage; Optimierungsbetrieb; Altanlage währenddessen Standby weiterhin zur Verfügung (BA 8)	6 Wochen	Mi 07.06.28	Di 18.07.28	20	hydraulisches Gewerk
22		Außerbetriebnahme u. Abrüstung der verbliebenen Filtergruppen des Altbestands; vollständige Demontagen (BA 9)	10 Wochen	Mi 16.08.28	Di 24.10.28	21EA+20 Tage	hydraulisches Gewerk
23		Aufbau des Endausbaus auf der Reinwasserseite im Bereich der nun leeren Hallenhälfte (BA 10)	4 Wochen	Mi 27.12.28	Di 23.01.29	22EA+45 Tage	hydraulisches Gewerk
24		Umbindung der Neuanlage auf den Endausbauzustand; Rückbau von Provisorien (BA 11)	3 Wochen	Mi 24.01.29	Di 13.02.29	23	hydraulisches Gewerk
25		Fertigstellung Metallbau Endausbau (BA 12)	5 Wochen	Mi 14.02.29	Di 20.03.29	24	hydraulisches Gewerk
26		Restarbeiten	4 Wochen	Mi 21.03.29	Di 17.04.29	25	hydraulisches Gewerk
27		Aufmaß & Schlussrechnung	4 Wochen	Mi 18.04.29	Di 15.05.29	26	hydraulisches Gewerk
28							
29		**Bauliches Gewerk**	**616 Tage**	**Di 15.12.26**	**Di 24.04.29**		
30		Submission	1 Tag	Di 15.12.26	Di 15.12.26	2AA	bauliches Gewerk
31		Vergabe	20 Tage	Fr 01.01.27	Do 28.01.27	30	bauliches Gewerk
32		Baustelleneinweisung	1 Tag	Mo 15.02.27	Mo 15.02.27	4EE	bauliches Gewerk
33		Baustelleneinrichtung, Schützen aller Laufwege	1 Woche	Mo 28.06.27	Fr 02.07.27	9AA	bauliches Gewerk
34		Ertüchtigungen Betriebsgebäude und Fassade	22 Wochen	Mo 05.07.27	Fr 03.12.27	33	bauliches Gewerk
35		Abbrucharbeiten Leerplatz Filterstraße	2 Wochen	Mo 19.07.27	Fr 30.07.27	10	bauliches Gewerk
36		Dachöffnung linke Hälfte der Filterhalle	4 Wochen	Mi 04.08.27	Di 31.08.27	13	bauliches Gewerk
37		Bauliche Abbruch- und Ertüchtigungsarbeiten nach Abbruch Filtergruppe 1	3 Wochen	Mi 06.10.27	Di 26.10.27	15	bauliches Gewerk
38		Verschluss des Dachs im linken Hallenteil durch Neueindeckung	5 Wochen	Mi 17.11.27	Di 21.12.27	17	bauliches Gewerk
39		Dachöffnung rechte Hälfte der Filterhalle	4 Wochen	Mi 19.07.28	Di 15.08.28	21	bauliches Gewerk
40		Abbruch der Filterfüße im Bereich der rechten Hallenhälfte; Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Auftriebssicherheit der Filterhalle im nun leeren Hallenteil	9 Wochen	Mi 25.10.28	Di 26.12.28	22	bauliches Gewerk
41		Herstellung des Bodenbelags in der Filterhalle gem. Endausbau	6 Wochen	Mi 14.02.29	Di 27.03.29	24	bauliches Gewerk
42		Aufmaß & Schlussrechnung	4 Wochen	Mi 28.03.29	Di 24.04.29	41	bauliches Gewerk
43							
44		**Elektrisches Gewerk**	**412 Tage**	**Mo 12.07.27**	**Di 06.02.29**		
45		Die elektrischen Arbeiten zur Außerbetriebnahme der Filtergruppe 1 sind parallel zum baulichen und hydraulischen Gewerk auszuführen.	9 Wochen	Mo 12.07.27	Fr 10.09.27	9	elektrisches Gewerk
46		Die elektrischen Arbeiten zum Anschluss sämtlicher Betriebsmittel der Neuanlage sind parallel zum baulichen und hydraulischen Gewerk auszuführen.	50 Wochen	Mi 23.02.28	Di 06.02.29	18	elektrisches Gewerk

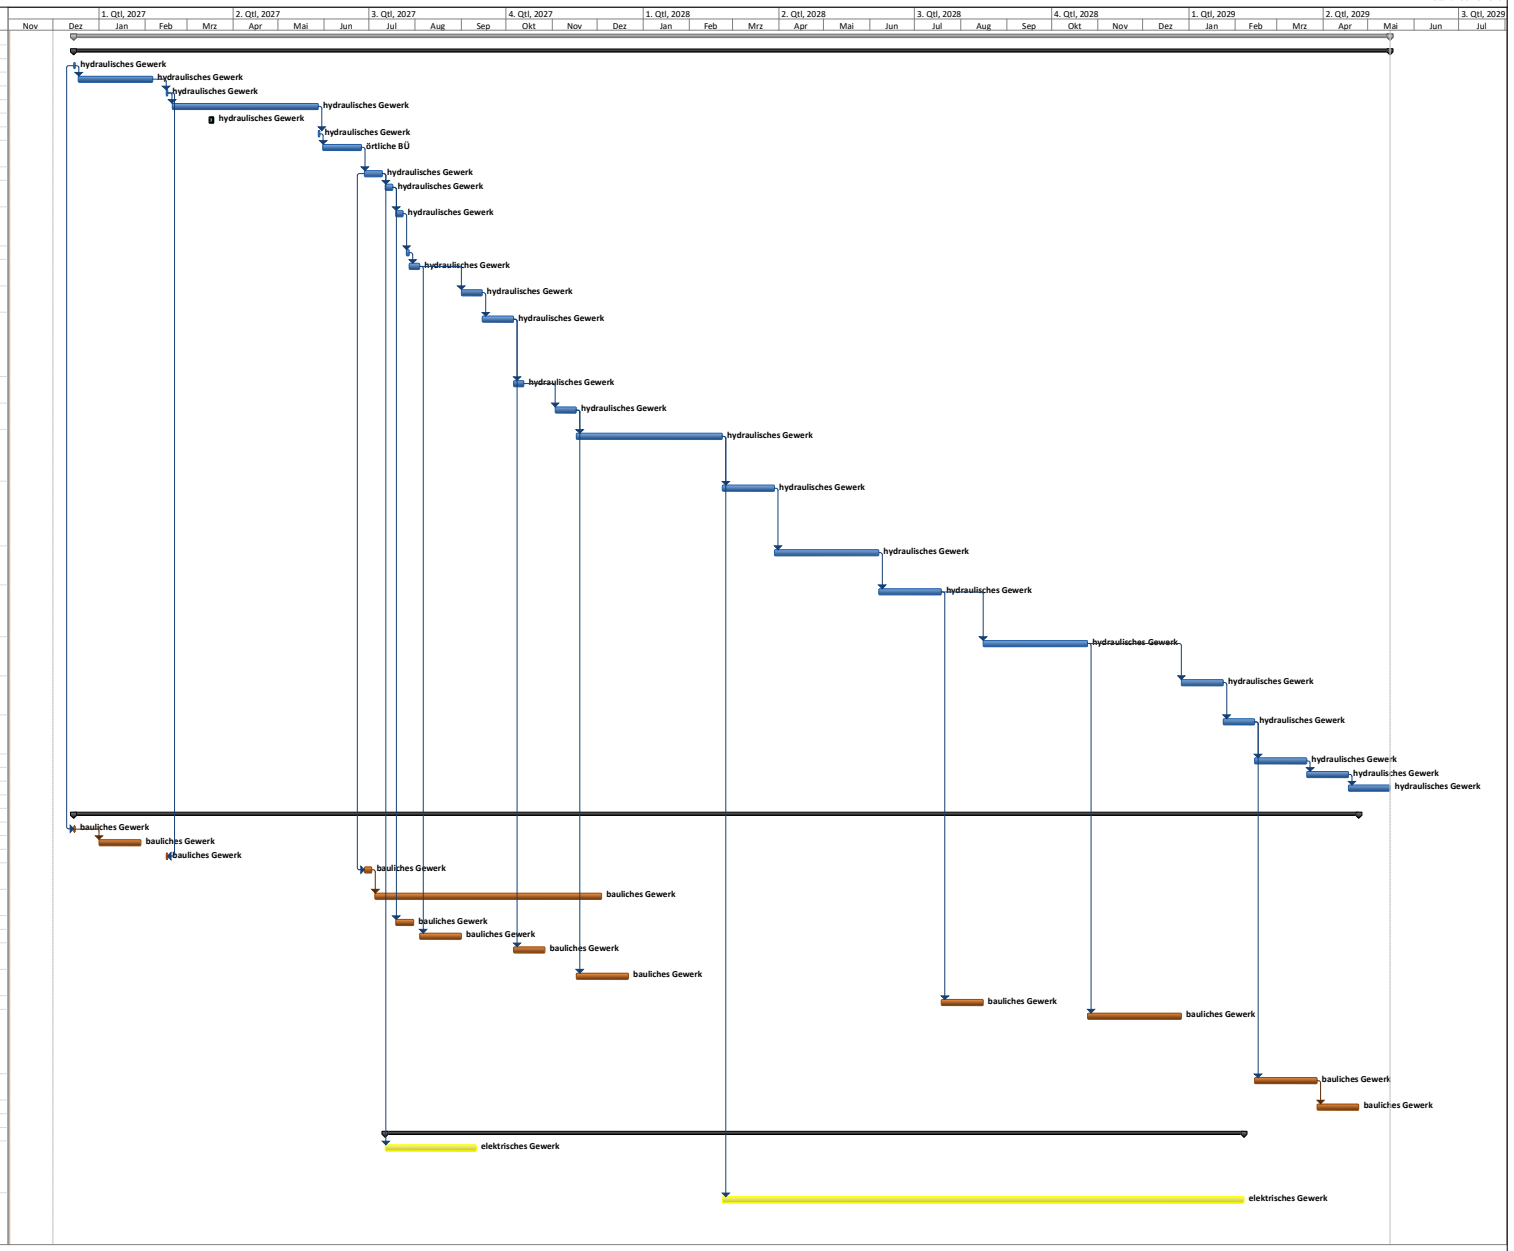

Projekt: 2023_363_2026_03_31_
Datum: Mo 02.11.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit
