Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Vergabeblatt	378 Tage	Mon 09.01.26	Don 01.07.27
2	SGF3	364 Tage	Mon 09.01.26	Don 01.07.27
3	Baustelleneinrichtung	60 Tage	Mon 09.01.26	Fre 26.03.26
4	Baustrom	60 Tage	Mon 09.01.26	Fre 26.03.26
5	Rohbau- und Aushubarbeiten	60 Tage	Mon 12.01.26	Fre 02.04.26
6	Dachabdichtung	60 Tage	Mit 14.01.26	Mit 08.04.26
7	Metallbau	60 Tage	Fre 23.01.26	Fre 10.04.26
8	Fenster / Aufhlenen	310 Tage	Fre 28.08.26	Fre 12.02.27
9	Elektroarbeiten	60 Tage	Fre 30.04.27	Don 22.07.27
10	OP-Wände und Decken, Trockenbau	160 Tage	Fre 31.07.26	Mit 31.03.27
11	Heizung	60 Tage	Fre 13.11.26	Fre 19.02.27
12	WDVS	60 Tage	Fre 13.11.26	Fre 19.02.27
13	Malerarbeiten	60 Tage	Don 21.01.27	Don 15.04.27
14	AUF	359 Tage	Mon 09.01.26	Mon 15.06.27
15	Vorarbeitsräumen	60 Tage	Mon 09.01.26	Fre 26.03.26
16	Sanitär	60 Tage	Mon 09.01.26	Mon 06.04.26
17	Heizung und Kälte	310 Tage	Mon 12.01.26	Mon 29.03.27
18	Lüftung	310 Tage	Mon 12.01.26	Mon 29.03.27
19	Med. Gase	307 Tage	Mit 07.08.26	Fre 29.01.27
20	MSR/GLT	314 Tage	Mit 02.09.26	Mon 25.01.27
21	GHUSE	319 Tage	Mon 09.11.26	Fre 12.02.27
22	Baustelleneinrichtung -	60 Tage	Mon 09.11.26	Fre 05.02.27
23	Starkstromanlagen	60 Tage	Fre 06.11.26	Fre 12.02.27
24	Kommunikations-, Sicherheits- und informationstechnische Anlagen	60 Tage	Fre 06.11.26	Fre 12.02.27
25	Kompensation und Anbindung RWA	6 Tage	Don 14.01.27	Fre 12.02.27
26	Blitzschutzanlagen	60 Tage	Mit 13.01.27	Mit 07.04.27
27	SGF-MT	279 Tage	Fre 31.07.26	Don 14.04.27
28	Deckenversorgungsschiene	160 Tage	Fre 31.07.26	Mit 31.03.27
29	OP- und Untersuchungsleuchten	60 Tage	Fre 18.12.26	Mit 31.03.27
30	Untersuchungsliegen, Stahlbett und Schwesternruf	160 Tage	Don 28.01.27	Mit 31.03.27
31	Videomanagementsystem	60 Tage	Don 28.01.27	Fre 23.04.27
32	Notstromversorgung	60 Tage	Don 28.01.27	Fre 23.04.27
33	Kompensation und Anbindung RWA	6 Tage	Don 14.01.27	Fre 12.02.27
34	Blitzschutzanlagen	60 Tage	Mit 13.01.27	Mit 07.04.27
35	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 12.06.26
36	Container aufbau	5 Tage	Mon 09.03.26	Mon 16.06.26
37	Baustrom	5 Tage	Mon 09.03.26	Mon 16.06.26
38	Aufzeichnungen	70 Tage	Mon 09.03.26	Fre 18.06.26
39	Arbeiten im OP-Trakt	2 Tage	Mon 09.03.26	Die 10.03.26
40	Arbeiten Container OP/ITS	3 Tage	Mon 09.03.26	Mit 11.03.26
41	Chirurgie Region	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
42	Trespasses RTW Zufahrt	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
43	Herstellen Baugrube	20 Tage	Mon 09.03.26	Fre 03.04.26
44	Aufnahme Pfosten	5 Tage	Mon 09.03.26	Mon 16.03.26
45	Herstellen Leitungen	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26
46	Herstellen Baugrube	5 Tage	Mon 09.03.26	Mon 16.03.26
47	Aufstellung Container	2 Tage	Don 09.04.26	Fre 10.04.26
48	Rohbau	264 Tage	Mon 17.08.26	Mit 14.04.27
49	Aufbau Gerüst Fassade	2 Tage	Mon 17.08.26	Die 18.08.26
50	Einrüstung Decken	3 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
51	Rückbau WDVS Fassade 1.OG	7 Tage	Mon 24.08.26	Die 01.09.26
52	Aufbruchsarbeiten an Wänden 1.OG und pau- schal	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
53	Rückbau Gerüst	1 Tag	Mit 02.09.26	Mit 02.09.26
54	Fundamente	30 Tage	Don 03.09.26	Mit 14.10.26
55	Aufbau Gerüst Fahrbau / Fassade	1 Tag	Do 03.09.26	Do 03.09.26
56	Stützen	10 Tage	Mit 23.09.26	Die 06.10.26
57	Decke über EG	10 Tage	Mit 07.10.26	Die 20.10.26
58	Wände	15 Tage	Mit 21.10.26	Die 10.11.26
59	Decke über OG	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26
60	Abbruch Betondecke	5 Tage	Mit 25.11.26	Die 01.12.26
61	Stützen über Schalter	5 Tage	Mit 02.12.26	Die 08.12.26
62	Öffnungen über schalter und einputzen	5 Tage	Do 25.02.27	Mon 01.03.27
63	Aufbruch Beton Fundament zwischen Achse 6/F	7 Tage	Die 09.02.27	Mit 17.02.27
64	Vorbereitungsarbeiten Vorschrift OP1/2	3 Tage	Die 23.02.27	Don 25.02.27
65	Fenster und Aufhlenen	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27
66	WDVS Ohne Dämmung	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
67	Dachabdichtung	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
68	Beschichtung Wandoberflächen	3 Tage	Mit 03.03.27	Fre 05.03.27
69	Herstellen Kommissionierung	4 Tage	Mon 01.03.27	Don 04.03.27
70	Rückbau Stahlträger & Stützen	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27
71	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.04.27
72	Rückbau Gerüst Fassade	3 Tage	Mon 08.03.27	Mit 10.03.27
73	Einrüstung Fassade	3 Tage	Mon 08.03.27	Mit 10.03.27
74	Rückbau Gerüst Fassade	3 Tage	Mon 08.03.27	Mit 10.03.27
75	Rückbau Gerüst Fassade	3 Tage	Mon 08.03.27	Mit 10.03.27
76	Metallbauarbeiten	150 Tage	Fre 18.12.26	Mit 04.08.27
77	Lamellenwand	90 Tage	Fre 18.12.26	Mit 12.05.27
78	Stahlträger	15 Tage	Fre 18.12.26	Don 21.01.27
79	Abbruch Lamellen	5 Tage	Mit 09.06.27	Mit 23.06.27
80	Aufbetten 2.OG	5 Tage	Fre 29.01.27	Don 04.02.27
81	Gitterroste	5 Tage	Mit 17.02.27	Die 23.02.27
82	Treppen	2 Tage	Fre 05.02.27	Mon 08.02.27
83	Schwellen OP2/3 zum Vorraumgriffel	1 Tag	Fre 04.06.27	Fre 04.06.27
84	Abbruch OP1/2	12 Tage	Fre 29.01.27	Mon 15.02.27
85	Stahlbeton Vorspringgriffel Bereich Schwellen und Belichtung	1 Tag	Fre 29.01.27	Mon 01.02.27
86	Fenster Türen und Belichtung	3 Tage	Mon 01.02.27	Mit 03.02.27
87	Fenster Türen und Belichtung	4 Tage	Mit 10.02.27	Die 16.02.27
88	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.03.27
89	Abbruch OP1/2	15 Tage	Mon 15.02.27	Mon 08.03.27
90	Stahlbeton Vorspringgriffel Bereich Schwellen und Belichtung	1 Tag	Mon 15.02.27	Mon 15.02.27
91	Fenster Türen und Belichtung	3 Tage	Mon 01.03.27	Mit 03.03.27
92	Fenster Türen und Belichtung	4 Tage	Mit 10.03.27	Die 16.03.27
93	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 15.03.27	Fre 23.04.27
94	Beschichtung Lüftung OP1/2 Boden	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27
95	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 15.03.27	Mon 22.03.27
96	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 15.03.27	Mon 22.03.27
97	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 15.03.27	Fre 23.04.27
98	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 29.03.27	Mon 05.04.27
99	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 29.03.27	Mon 05.04.27
100	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 29.03.27	Fre 30.04.27
101	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 12.04.27	Mon 19.04.27
102	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 12.04.27	Mon 19.04.27
103	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 12.04.27	Fre 14.05.27
104	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 26.04.27	Mon 03.05.27
105	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 26.04.27	Mon 03.05.27
106	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 26.04.27	Fre 28.05.27
107	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 10.05.27	Mon 17.05.27
108	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 10.05.27	Mon 17.05.27
109	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 10.05.27	Fre 11.06.27
110	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 24.05.27	Mon 31.05.27
111	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 24.05.27	Mon 31.05.27
112	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 24.05.27	Fre 25.06.27
113	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 07.06.27	Mon 14.06.27
114	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 07.06.27	Mon 14.06.27
115	med. Gase EG	5 Tage	Mon 21.06.27	Mon 28.06.27
116	Abbruchgerüst	5 Tage	Mon 21.06.27	Mon 28.06.27
117	Rückbau Gerüst Fassade	3 Tage	Mon 21.06.27	Mit 23.06.27
118	Beschichtung Lüftung OP1/2 Boden	20 Tage	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27
119	Einbau Ver. & Entsorgungsleitungen Sanitär	5 Tage	Mon 19.07.27	Mon 26.07.27
120	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 19.07.27	Mon 26.07.27
121	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 19.07.27	Mon 26.07.27
122	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 19.07.27	Fre 20.08.27
123	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 02.08.27	Mon 09.08.27
124	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 02.08.27	Mon 09.08.27
125	Schutzbekleidung und Abdichtung Fenster/Türen	25 Tage	Mon 02.08.27	Fre 03.09.27
126	Einbau Med. Gase 1.OG OP	5 Tage	Mon 16.08.27	Mon 23.08.27
127	Lüftung OP1/2	5 Tage	Mon 16.08.27	Mon 23.08.27
128	Einbau Ver. & Entsorgungsleitungen Sanitär	5 Tage	Mon 30.08.27	Mon 06.09.27
129	Elektro	368 Tage	Mon 09.01.26	Mit 01.09.27
130	Elektroanschluss Container	2 Tage	Mon 09.03.26	Die 10.03.26
131	Blitzschutz unter Fundament	5 Tage	Mit 02.09.26	Die 08.09.26
132	Rückbau Installationen	10 Tage	Fre 12.02.27	Don 25.02.27
133	Rückbau Installationen Vorspriegriffel, OP1/2	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
134	Vorspriegriffel Trassen	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27

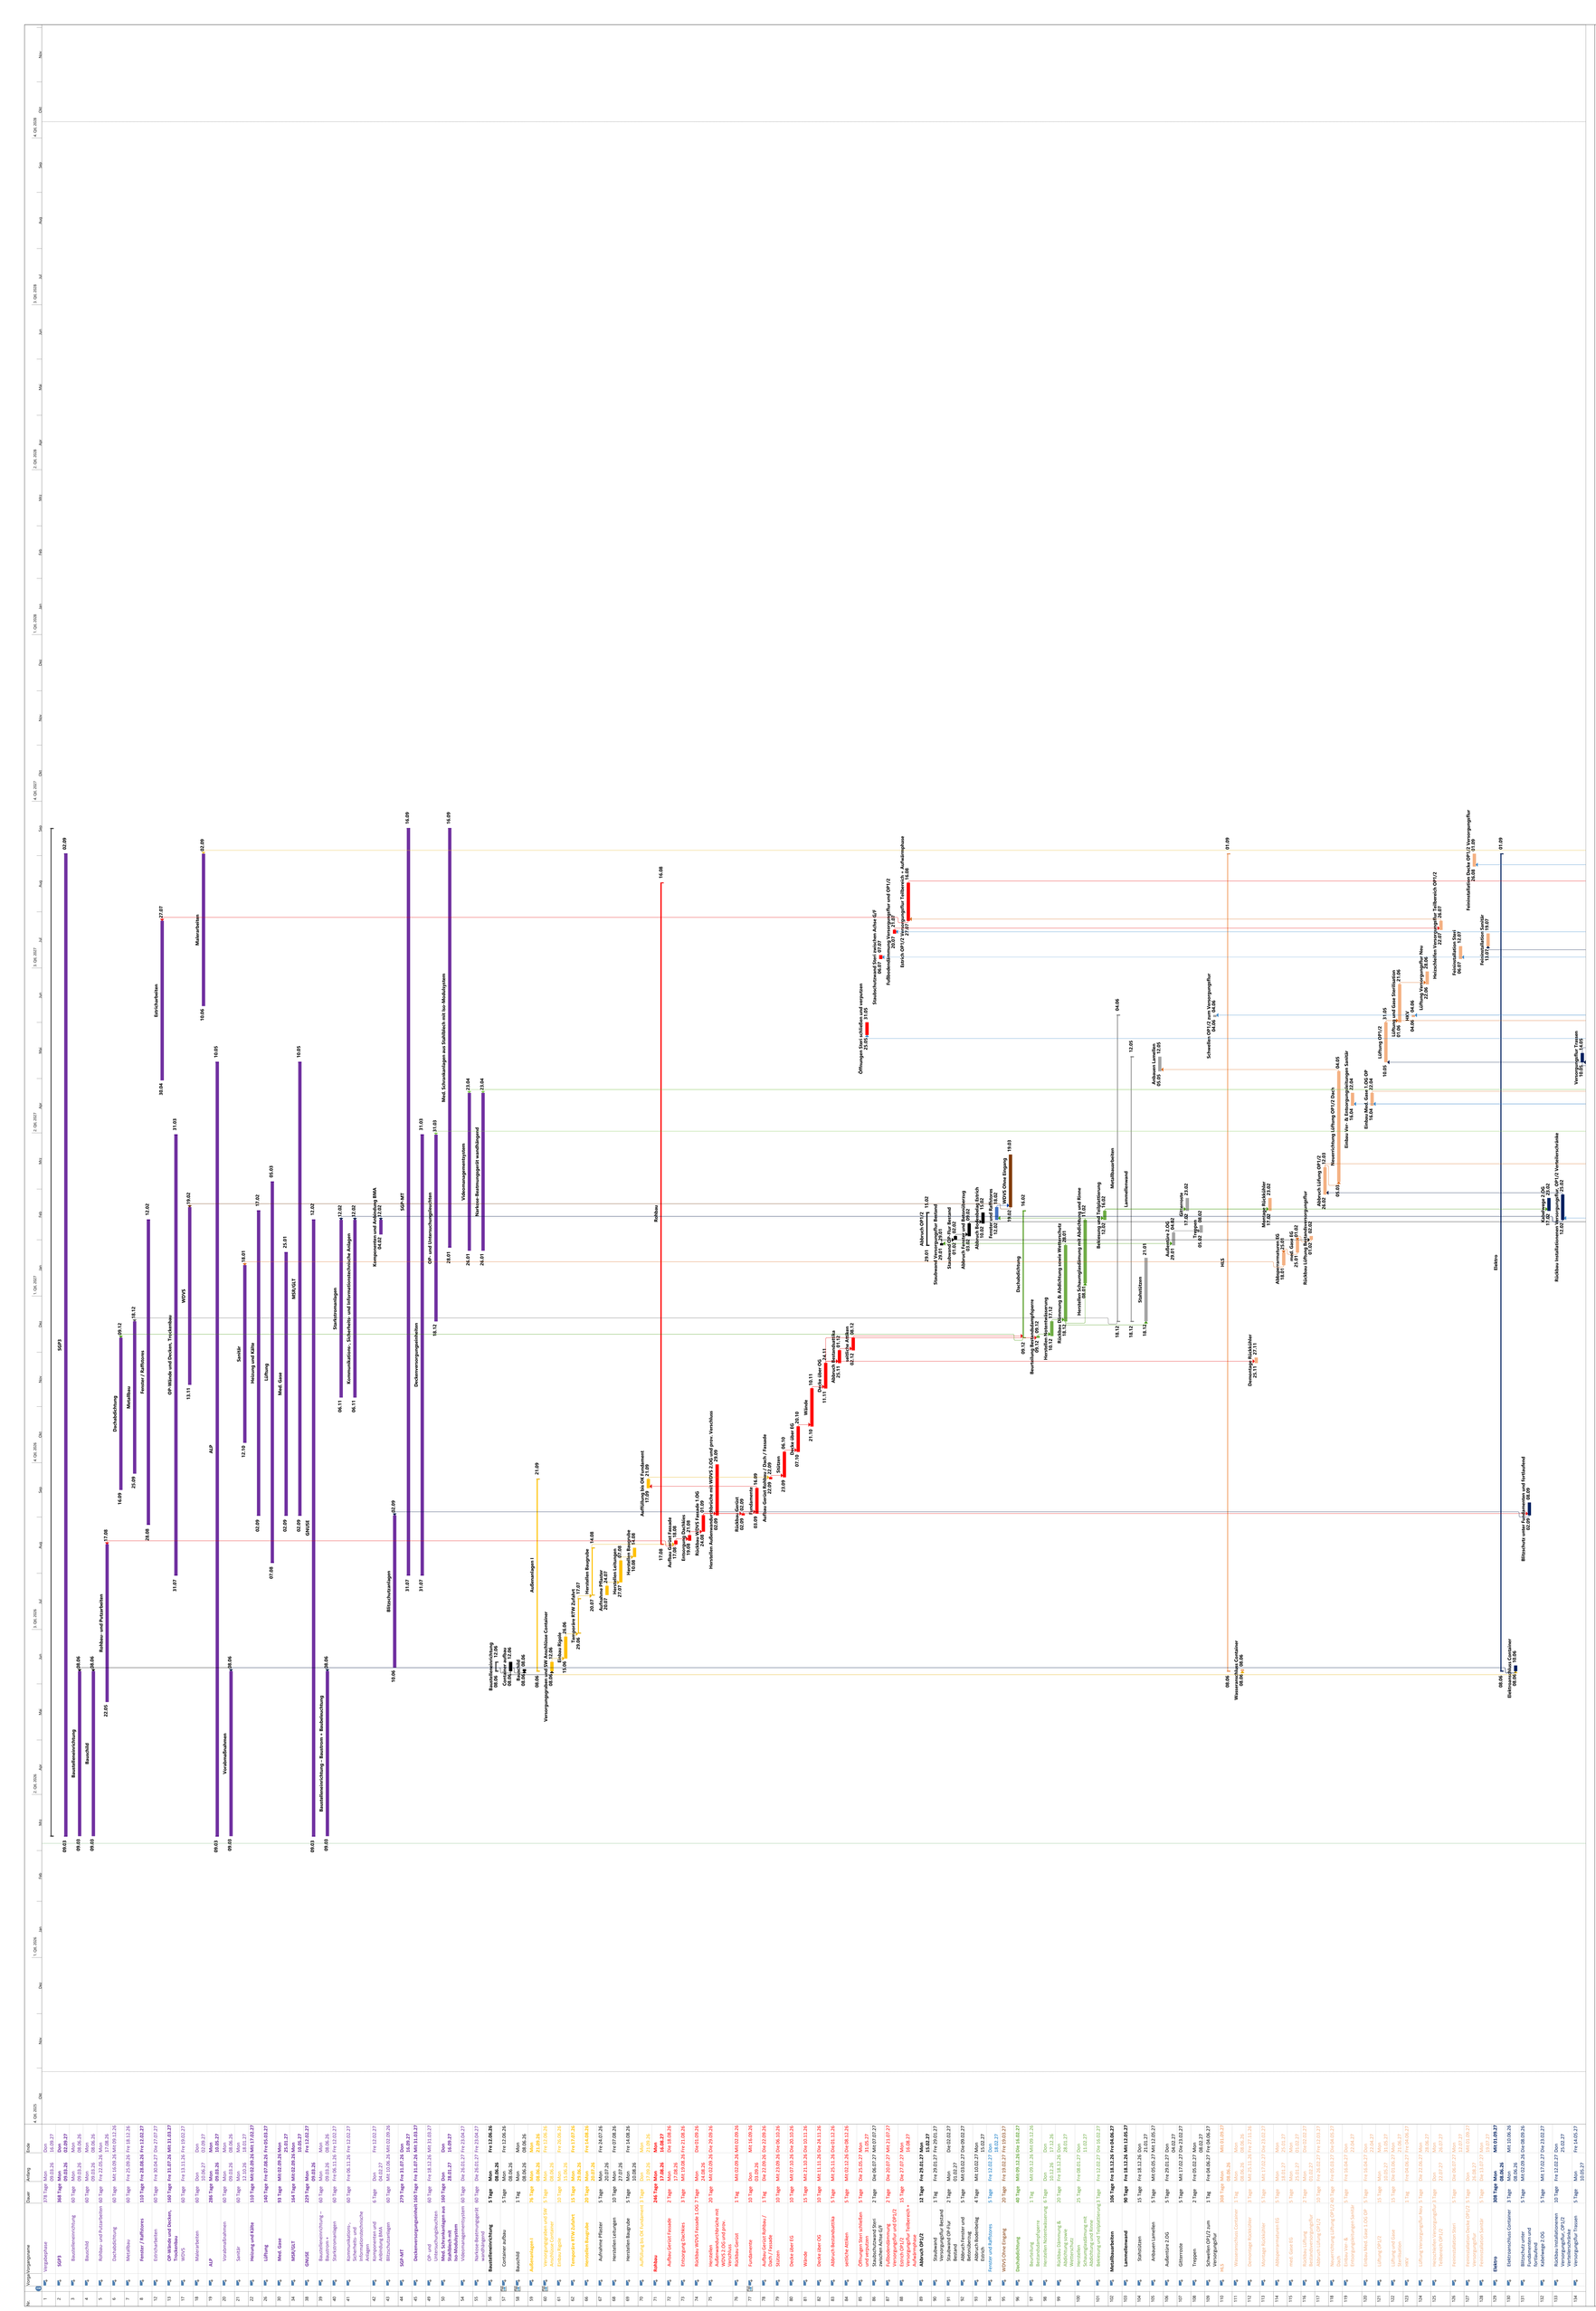

Nr.	Vorga	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
135		Kabeltrassen Leitungen OP1/2 & Montage Verteiler Zentrale	10 Tage	Fre 23.04.27	Fre 07.05.27
136		Sterilisation	15 Tage	Die 01.06.27	Mon 21.06.27
137		Feininstallation Steri	5 Tage	Die 06.07.27	Mon 12.07.27
138		Feininstallation Wände OP1/2 Versorgungsflur	5 Tage	Die 13.07.27	Mon 19.07.27
139		Feininstallation Decke OP1/2 Versorgungsflur	5 Tage	Don 26.08.27	Mit 01.09.27
140		Trockenbau	148 Tage	Mit 10.02.27	Fre 10.09.27
141		Abbruch Decke	2 Tage	Mit 10.02.27	Don 11.02.27
142		Abbruch Trockenbauwände& herstellen Staubschutz Übergang OP3	10 Tage	Mon 15.03.27	Die 30.03.27
143		UK Vorsatzschalen OP Wände	12 Tage	Mit 31.03.27	Don 15.04.27
144		Vorbereiten des Abbruchs - Schützen der Geräte	5 Tage	Die 18.05.27	Die 25.05.27
145		Abbruch GK-Decke Steri	5 Tage	Die 25.05.27	Die 01.06.27
146		UK Wände Versorgungsflur	13 Tage	Die 18.05.27	Don 03.06.27
147		Wandbekleidung und Zargen OP1/2	10 Tage	Fre 04.06.27	Don 17.06.27
148		Decke Steri einbauen	10 Tage	Die 22.06.27	Mon 05.07.27
149		Vorwand Waschraum OP5 und Schleuse zwischen Achse2/3	3 Tage	Die 22.06.27	Don 24.06.27
150		Wandbekleidung Versorgungsflur Neu	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27
151		UK Rasterdecke OP1/2 Versorgungsflur	7 Tage	Die 17.08.27	Mit 25.08.27
152		Schließen Rasterdecke	7 Tage	Don 02.09.27	Fre 10.09.27
153		**Med Technik**	**124 Tage**	**Mit 31.03.27**	**Mit 22.09.27**
154		UK DVE & OP-Leuchten Med	3 Tage	Mit 31.03.27	Fre 02.04.27
155		Anbau DVE & OP-Leuchten	2 Tage	Don 02.09.27	Fre 03.09.27
156		Videotechnik Vorbereitung	5 Tage	Fre 23.04.27	Don 29.04.27
157		Videotechnik feininstallation	5 Tage	Die 13.07.27	Mon 19.07.27
158		Schrankanlagen	5 Tage	Don 16.09.27	Mit 22.09.27
159		MSR/GLT Leitungsverlegung	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27
160		MSR/GLT Grobinstallation	2 Tage	Mit 02.06.27	Fre 04.06.27
161		MSR/GLT Feininstallation	2 Tage	Fre 18.06.27	Mon 21.06.27
162		**Malerarbeiten**	**10 Tage**	**Don 02.09.27**	**Mit 15.09.27**
163		Wände Versorgungsflur Teilbereich	2 Tage	Don 02.09.27	Fre 03.09.27
164		Wandschutz	3 Tage	Mon 06.09.27	Mit 08.09.27
165		Bodenbelag	5 Tage	Don 09.09.27	Mit 15.09.27
166		**Inbetriebnahmen**	**77 Tage**	**Die 13.07.27**	**Mit 27.10.27**
167		Steri	30 Tage	Die 13.07.27	Mon 23.08.27
168		OP1/2 Versorgungsflur	30 Tage	Don 16.09.27	Mit 27.10.27
169		Winterbaubeheizung	140 Tage	Mon 14.09.26	Mit 14.04.27
170					
171					
172		Putz Versorgungsflur	5 Tage	Die 18.04.28	Mon 24.04.28
173		Fußbodendämmung Versorgungflur und OP3/4/5	2 Tage	Die 16.05.28	Mit 17.05.28
174		EstrichOP 3/4/5 Versorgungflur Teilbereich + Aufwärmphase	15 Tage	Mit 24.05.28	Die 13.06.28
175		Außentreppe	30 Tage	Mit 31.05.28	Die 11.07.28
176		Vordach	10 Tage	Mit 12.07.28	Die 25.07.28
177		Anarbeiten WDVS Treppe	10 Tage	Mit 26.07.28	Die 08.08.28
178		Fliesen und Plattenarbeiten	10 Tage	Mit 09.08.28	Die 22.08.28
179		Außenanlagen fertigstellen	20 Tage	Mit 23.08.28	Die 19.09.28
180		**Abbruch OP3/4/5**	**24 Tage**	**Don 18.11.27**	**Die 21.12.27**
181		Staubwand Versorgungsflur	2 Tage	Don 18.11.27	Fre 19.11.27
182		Staubwand Pat.-Schl.	2 Tage	Mon 22.11.27	Die 23.11.27
183		Abbruch Fenster und Betonüberzug	10 Tage	Mit 24.11.27	Die 07.12.27
184		Abbruch Bodenbelag und Estrich	10 Tage	Mit 08.12.27	Die 21.12.27
185		HLS	123 Tage	Don 13.01.28	Mon 03.07.28
186		Rückbau Lüftung Bestandsversorgungsflur	3 Tage	Don 13.01.28	Mon 17.01.28
187		Abbruch Lüftung OP3/4/5	7 Tage	Die 25.01.28	Mit 02.02.28
188		Neuanrichtung Lüftung OP3/4/5 2.OG	20 Tage	Don 03.02.28	Mit 01.03.28
189		Einbau Ver- & Entsorgungsleitungen Sanitär	7 Tage	Mon 06.03.28	Die 14.03.28
190		Einbau Med. Gase 1.OG OP3/4/5	8 Tage	Mon 06.03.28	Mit 15.03.28
191		Lüftung OP3/4/5	10 Tage	Don 16.03.28	Mit 29.03.28
192		Lüftung Versorgungsflur Neu	2 Tage	Don 30.03.28	Fre 31.03.28
193		Heizschleifen Versorgungflur OP3/4/5	4 Tage	Don 18.05.28	Die 23.05.28
194		Feininstallation Decke OP3/4/5 Versorgungsflur	7 Tage	Fre 23.06.28	Mon 03.07.28
195		Feininstallation Sanitär	7 Tage	Die 16.05.28	Mit 24.05.28
196		**Elektro**	**126 Tage**	**Don 13.01.28**	**Don 06.07.28**
197		Rückbau Installationenen Versorgungflur, OP3/4/5	8 Tage	Don 13.01.28	Mon 24.01.28
198		Kabeltrassen Leitungen OP3/4/5	10 Tage	Don 16.03.28	Mit 29.03.28
199		Versorgungflur Restarbeiten	3 Tage	Don 30.03.28	Mon 03.04.28
200		Feininstallation Wände OP3/4/5	10 Tage	Die 16.05.28	Mon 29.05.28
201		Feininstallation Decke OP3/4/5 Versorgungsflur	10 Tage	Fre 23.06.28	Don 06.07.28
202		Trockenbau	143 Tage	Mit 22.12.27	Mon 17.07.28
203		Abbruch Decken	10 Tage	Mit 22.12.27	Mit 12.01.28
204		Abbruch Trockenbauwände	10 Tage	Don 19.02.28	Mit 16.02.28
205		UK Vorsatzschalen OP Wand	12 Tage	Don 17.02.28	Fre 03.03.28
206		UK Wände Versorgungsflur	10 Tage	Die 04.04.28	Mon 17.04.28
207		Wandbekleidung und Zargen OP3/4/5	10 Tage	Die 18.04.28	Mon 01.05.28
208		Wandbekleidung Versorgungflur Neu	10 Tage	Die 02.05.28	Mon 15.05.28
209		UK Rasterdecke OP3/4/5 Versorgungsflur	7 Tage	Mit 14.06.28	Don 22.06.28
210		Schließen Rasterdecke	7 Tage	Fre 07.07.28	Mon 17.07.28
211		**Med Technik**	**138 Tage**	**Don 17.02.28**	**Mon 28.08.28**
212		UK DVE & OP-Leuchten Med	5 Tage	Don 17.02.28	Mit 23.02.28
213		Anbau DVE & OP-Leuchten	5 Tage	Fre 07.07.28	Don 13.07.28
214		Videotechnik Vorbereitung	7 Tage	Don 16.03.28	Fre 24.03.28
215		Videotechnik feininstallation	7 Tage	Die 16.05.28	Mit 24.05.28
216		Schrankanlagen	7 Tage	Fre 18.08.28	Mon 28.08.28
217		MSR/GLT Leitungsverlegung	7 Tage	Don 30.03.28	Fre 07.04.28
218		MSR/GLT Grobinstallation	4 Tage	Mit 12.04.28	Die 18.04.28
219		MSR/GLT Feininstallation	3 Tage	Die 02.05.28	Don 04.05.28
220		**Malerarbeiten**	**30 Tage**	**Fre 07.07.28**	**Don 17.08.28**
221		Wände Versorgungsflur Teilbereich	10 Tage	Fre 07.07.28	Don 20.07.28
222		Wandschutz	10 Tage	Fre 21.07.28	Don 03.08.28
223		Bodenbelag	10 Tage	Fre 04.08.28	Don 17.08.28
224		**Inbetriebnahmen**	**30 Tage**	**Die 29.08.28**	**Mon 09.10.28**
225		OP 3/4/5 Versorgungsflur	30 Tage	Die 29.08.28	Mon 09.10.28
226		Winterbaubeheizung	130 Tage	Mon 27.09.27	Mon 03.04.28
