
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	00_Externe Randbedingungen	336 Tage	Mon 14 Dez '26	Fre 07 Apr '28		
2	Schleusenrevision Main-Donau-Kanal 2027	15 Tage	Mon 05 Apr '27	Fre 23 Apr '27		Schleusenrevision
3	Schleusenrevision Main-Donau-Kanal 2028	16 Tage	Sam 18 Mrz '28	Fre 07 Apr '28		Schleusenrevision
4	Winterpause Asphaltmischwerke 2027	52 Tage	Mon 14 Dez '26	Don 01 Apr '27		Asphaltwerke
5	Winterpause Asphaltmischwerke 2028	59 Tage	Mon 13 Dez '27	Fre 03 Mrz '28		Asphaltwerke
6	Christkindlesmarkt Nürnberg 2027	21 Tage	Fre 26 Nov '27	Fre 24 Dez '27		Sperren
7	Betriebssperre Straßenbahn Linien 4 und 11	240 Tage	Mon 18 Jan '27	Mon 27 Dez '27		Sperren
8	Betriebssperre Straßenbahn Linie 5	150 Tage	Mon 31 Mai '27	Mon 27 Dez '27		Sperren
9						
10	01_Bauabschnitt 1 - Baubeginn Knoten Nimrodstraße, Wacholderweg und Falkenhorst (12/2026 bis 05/2027)	110 Tage	Mon 04 Jan '27	Mon 14 Jun '27		
11	Baufeld 5 - Knoten Nimrodstr.	88 Tage	Mon 04 Jan '27	Die 11 Mai '27		
18	Baufeld 18 - Feuerwehr bis Falkenhorst	69 Tage	Mon 04 Jan '27	Die 13 Apr '27		
24	Baufeld 24 - Falkenhorst bis Julius-Loßmann-Straße	64 Tage	Mon 04 Jan '27	Die 06 Apr '27		
29	Baufeld 21 - Knoten Falkenhorst	68 Tage	Don 07 Jan '27	Mit 14 Apr '27		
38	Baufeld 12 - Knoten Wacholderweg Mitte	73 Tage	Don 07 Jan '27	Mit 21 Apr '27		
46	Baufeld 13 - Minervastraße Mitte	80 Tage	Mon 11 Jan '27	Die 04 Mai '27		
54	Baufeld 8 - Knoten Nimrodstr. bis Wacholderweg	60 Tage	Mon 18 Jan '27	Die 13 Apr '27		
59	Baufeld 22 - Falkenhorst bis Hirschensuhl Mitte	61 Tage	Die 26 Jan '27	Don 22 Apr '27		
66	Baufeld 23 - Falkenhorst bis Hirschensuhl Süd	63 Tage	Mit 03 Mrz '27	Fre 04 Jun '27		
72	Baufeld 11.1 - Knoten Wacholderweg/Einfahrt Parkhaus	52 Tage	Fre 05 Mrz '27	Fre 21 Mai '27		
78	Baufeld 14.2 - Minervastraße Süd	61 Tage	Mon 15 Mrz '27	Mon 14 Jun '27		
83	Baufeld 14.1 - Einmündung Wacholderweg	47 Tage	Die 06 Apr '27	Mon 14 Jun '27		
89	Bauabschnitt 1 abgeschlossen - Baubeginn Knoten Nimrodstraße, Wacholderweg und Falkenhorst	0 Tage	Mon 14 Jun '27	Mon 14 Jun '27	28;58;23;37;45;65	
90						
91	02_Bauabschnitt 2 - Mittellage Minervaplatz, Hirschensuhl und Wendeschleife (01/2027 bis 08/2027)	164 Tage	Mon 18 Jan '27	Don 09 Sep '27		
92	Baufeld 4 - Löffelholzstr. bis Nimrodstr.	156 Tage	Mon 18 Jan '27	Mon 30 Aug '27		
106	Baufeld 25 - Hirschensuhl Mitte	120 Tage	Mit 03 Feb '27	Die 27 Jul '27		
114	Baufeld 9 - Dianastraße	146 Tage	Don 11 Feb '27	Don 09 Sep '27		
121	Baufeld 15 - Knoten Minervaplatz	93 Tage	Fre 12 Feb '27	Die 29 Jun '27		
133	Baufeld 16 - Minervaplatz bis Muldenweg Mitte	134 Tage	Die 16 Feb '27	Fre 27 Aug '27		
144	Baufeld 7 - Knoten Nimrodstr./ Dianastraße	64 Tage	Mon 19 Apr '27	Die 20 Jul '27		
150	Baufeld 11.2 - Knoten Wacholderweg bis Feuerwehr	79 Tage	Fre 23 Apr '27	Mon 16 Aug '27		
156	Bauabschnitt 2 abgeschlossen - Mittellage Minervaplatz, Hirschensuhl und Wendeschleife	0 Tage	Don 09 Sep '27	Don 09 Sep '27	149;132;113;155;1	
157						
158	03_Bauabschnitt 3 - Schleusenrevision 2027: Knoten Nimrodstraße (04/2027 bis 04/2027)	21,5 Tage	Die 30 Mrz '27	Mit 28 Apr '27		
159	Baufeld 6 - Knoten Nimrodstr.	21,5 Tage	Die 30 Mrz '27	Mit 28 Apr '27		
168	Bauabschnitt 3 abgeschlossen - Schleusenrevision 2027: Knoten Nimrodstraße	0 Tage	Mit 28 Apr '27	Mit 28 Apr '27	167	
169						
170	04_Bauabschnitt 4 - Betriebssperre Knoten Löffelholzstraße (09/2027 bis 11/2027)	65 Tage	Mon 23 Aug '27	Mon 22 Nov '27		
171	Baufeld 3 - Knoten Löffelholzstraße - SA	38 Tage	Mon 23 Aug '27	Mit 13 Okt '27		
182	Baufeld 2 - Knoten Löffelholzstraße - MI	39,5 Tage	Die 24 Aug '27	Mon 18 Okt '27		
191	Baufeld 1 - Knoten Löffelholzstraße - SE	31 Tage	Fre 08 Okt '27	Mon 22 Nov '27		
198	Bauabschnitt 4 abgeschlossen - Betriebssperre Knoten Löffelholzstraße	0 Tage	Mon 22 Nov '27	Mon 22 Nov '27	181;190;197	
199	Inbetriebnahme Neue Wendeschleife Gibitzenhof	0 Tage	Mon 22 Nov '27	Mon 22 Nov '27	92;171;182;191	
200						
201	05_Bauabschnitt 5 - Knoten Finkenbrunn, Anschluss Mausloch und Paumannstraße (08/2027 bis 07/2028)	298 Tage	Mon 31 Mai '27	Fre 28 Jul '28		
202	Knoten Finkenbrunn - Vorlaufmaßnahmen	60 Tage	Mon 31 Mai '27	Fre 20 Aug '27		
206	Baufeld 27 - Krzg. Minervastraße/Julius-Loßmann-Straße	38 Tage	Fre 13 Aug '27	Die 05 Okt '27		
213	Baufeld 30 - Julius-Loßmann-Straße bis Paumannstraße	149 Tage	Die 07 Sep '27	Mon 03 Apr '28		
225	Baufeld 28 - Knoten Finkenbrunn Mitte	111,5 Tage	Mit 10 Nov '27	Don 13 Apr '28		
233	Baufeld 29 - Anschluss Mausloch	68 Tage	Die 07 Dez '27	Fre 10 Mrz '28		
241	Baufeld 31 - Julius-Loßmann-Straße bis Paumannstraße Mitte Ost	57 Tage	Mon 08 Mai '28	Fre 28 Jul '28		
247	Bauabschnitt 5 abgeschlossen - Knoten Finkenbrunn, Anschluss Mausloch und Paumannstraße	0 Tage	Fre 28 Jul '28	Fre 28 Jul '28	212;240;224;232;2	
248						
249	06_Bauabschnitt 6 - Seitenfahrbahnen, Muldenweg und DB-Unterführung (04/2027 bis 04/2028)	274,5 Tage	Die 30 Mrz '27	Die 25 Apr '28		
250	Baufeld 19 - Muldenweg bis Falkenhorst Mitte	164 Tage	Die 30 Mrz '27	Don 18 Nov '27		
258	Baufeld 10 - Dianastraße - DB-Unterführung - Wacholderweg	255 Tage	Mon 26 Apr '27	Die 25 Apr '28		
266	Baufeld 17 - Minervaplatz bis Muldenweg Süd	80 Tage	Mon 12 Jul '27	Fre 29 Okt '27		
272	Baufeld 20 - Muldenweg bis Falkenhorst Mitte	53 Tage	Mon 04 Okt '27	Don 16 Dez '27		
278	Bauabschnitt 6 abgeschlossen - Seitenfahrbahnen, Muldenweg und DB-Unterführung	0 Tage	Die 25 Apr '28	Die 25 Apr '28	271;257;277;265	
279						
280	07_Bauabschnitt 7 - Schleusenrevision 2028: Baufelder 26 und 32 (03/2028 bis 05/2028)	108 Tage	Mit 23 Feb '28	Fre 28 Jul '28		
281	Baufeld 26 - Hirschensuhl bis Finkenbrunn	65 Tage	Mit 23 Feb '28	Fre 26 Mai '28		
288	Baufeld 32 - Finkenbrunn bis Paumannstraße	26 Tage	Die 28 Mrz '28	Fre 05 Mai '28		
295	Bauabschnitt 7 abgeschlossen - Schleusenrevision 2028: Baufelder 26 und 32	0 Tage	Fre 26 Mai '28	Fre 26 Mai '28	294;287	
296						
297	Gleisbau Strecke durchgehend fertiggestellt	0 Tage	Die 25 Apr '28	Die 25 Apr '28	187;176;96;164;1	
298	Gesamtfertigstellung TMS	0 Tage	Fre 28 Jul '28	Fre 28 Jul '28	197;190;181;105;1	
299	Inbetriebnahme TMS	0 Tage	Fre 28 Jul '28	Fre 28 Jul '28	298	

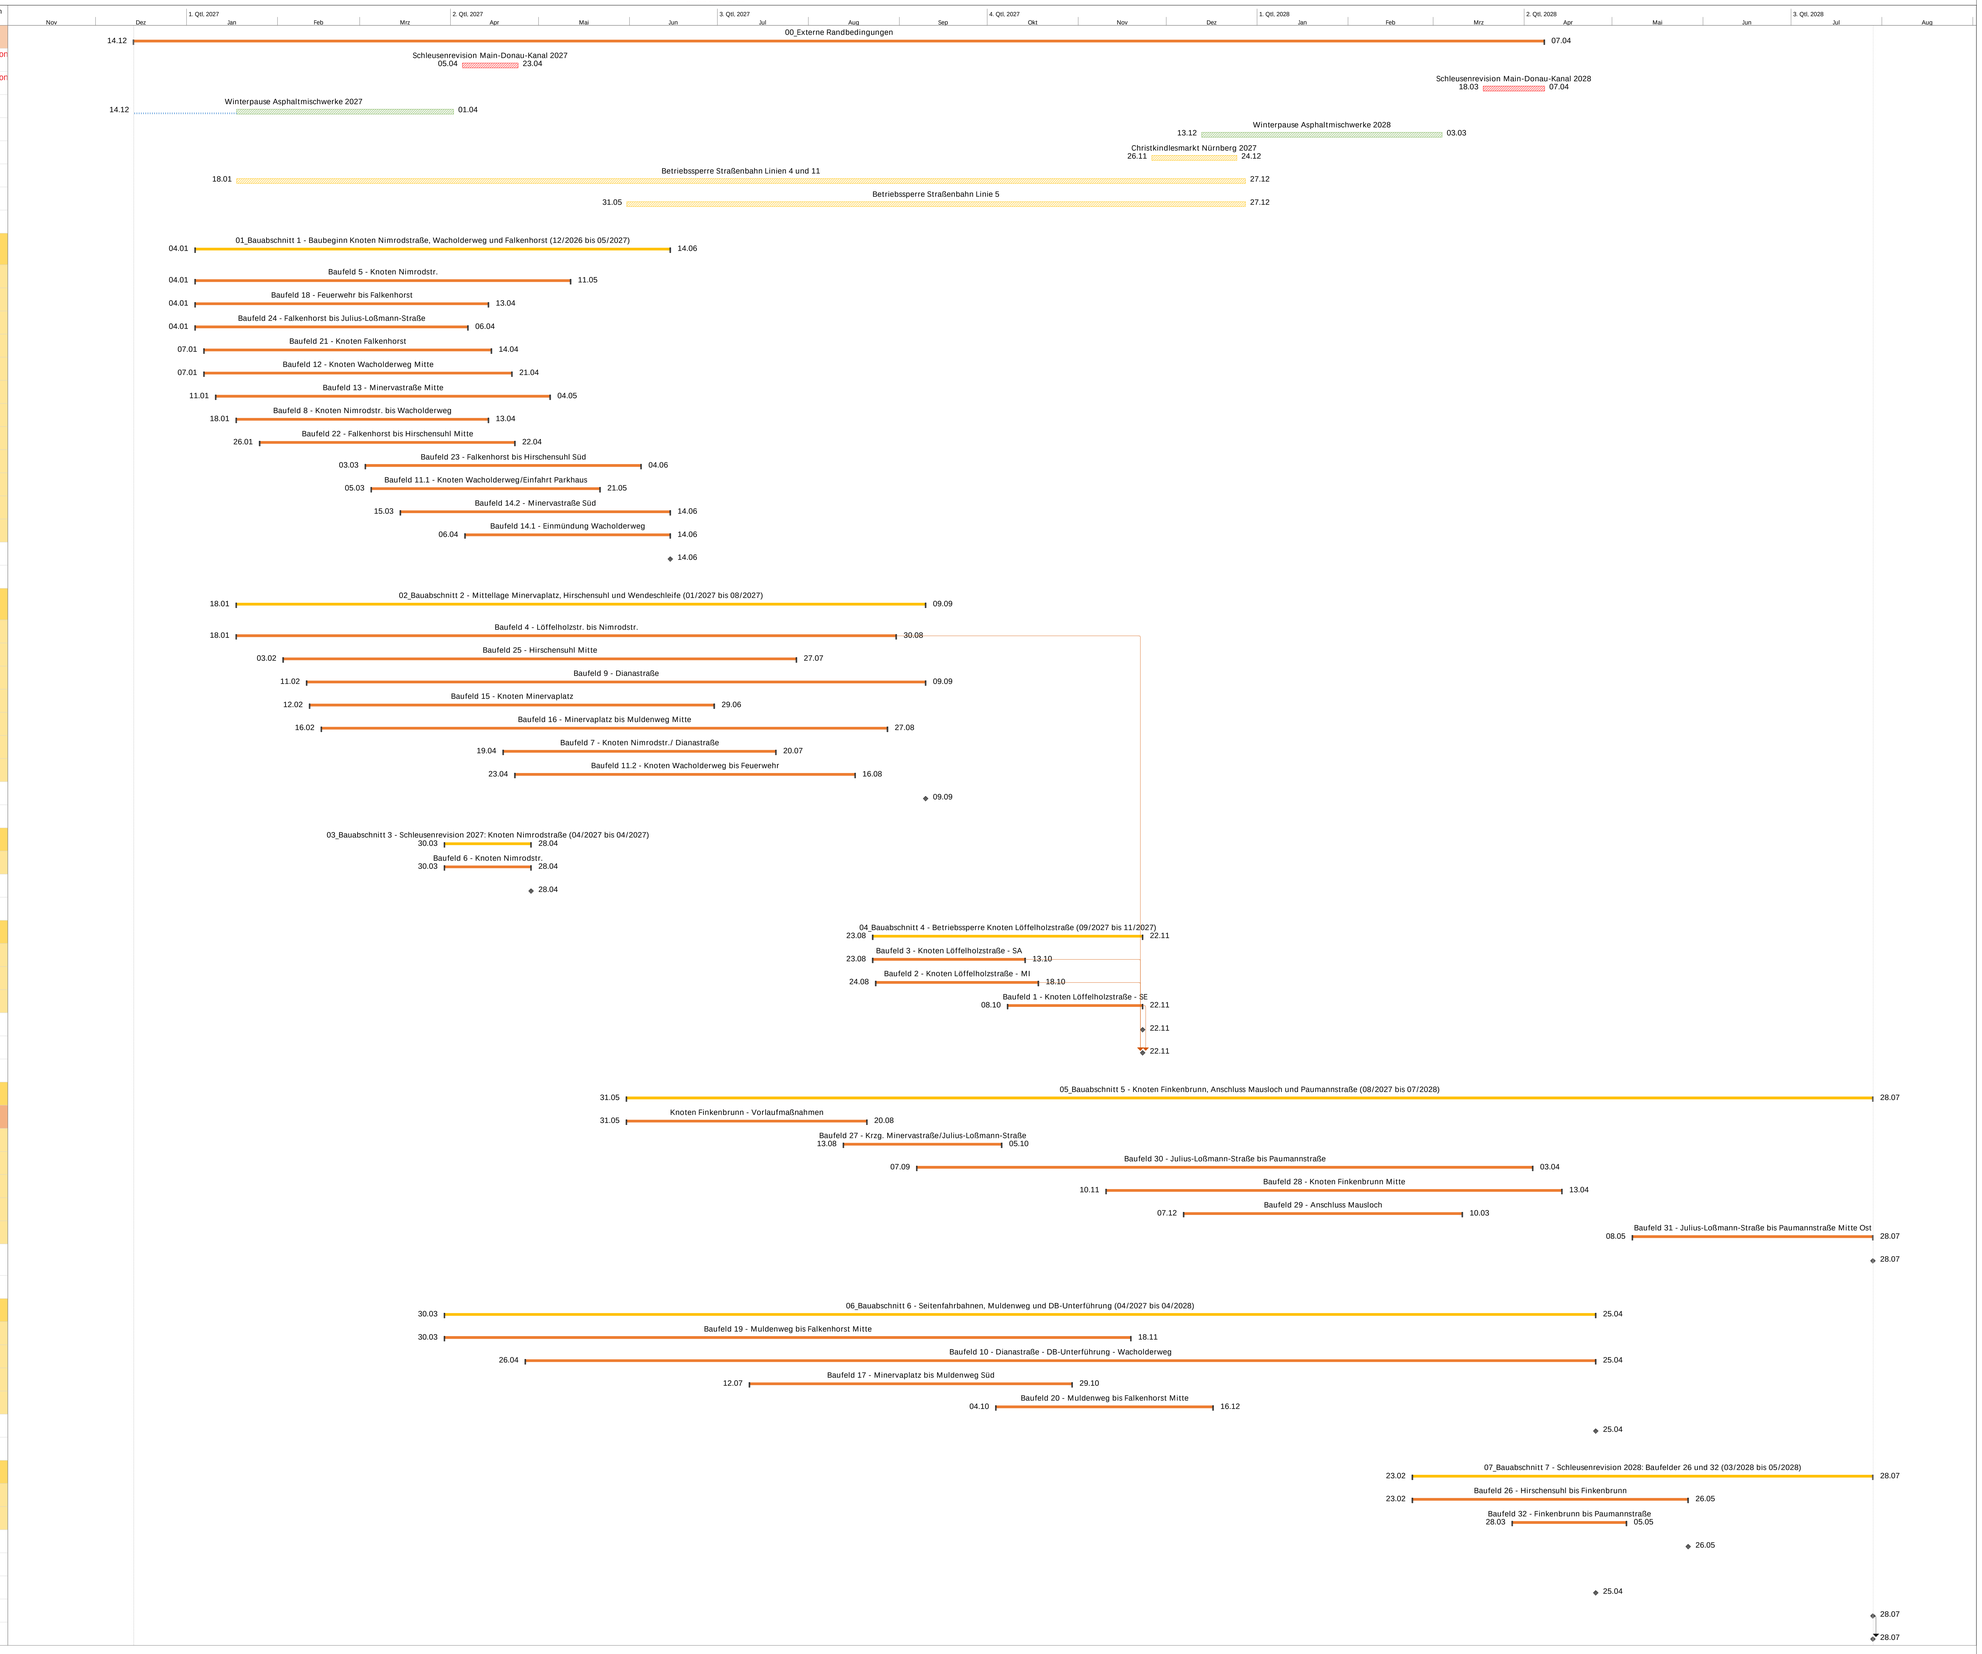

Projekt: TMS Masterterminplan
Datum: Die 15 Sep '26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt
