Projektnummer: 2210

Feuerwehr und Rettungswache Cremlingen
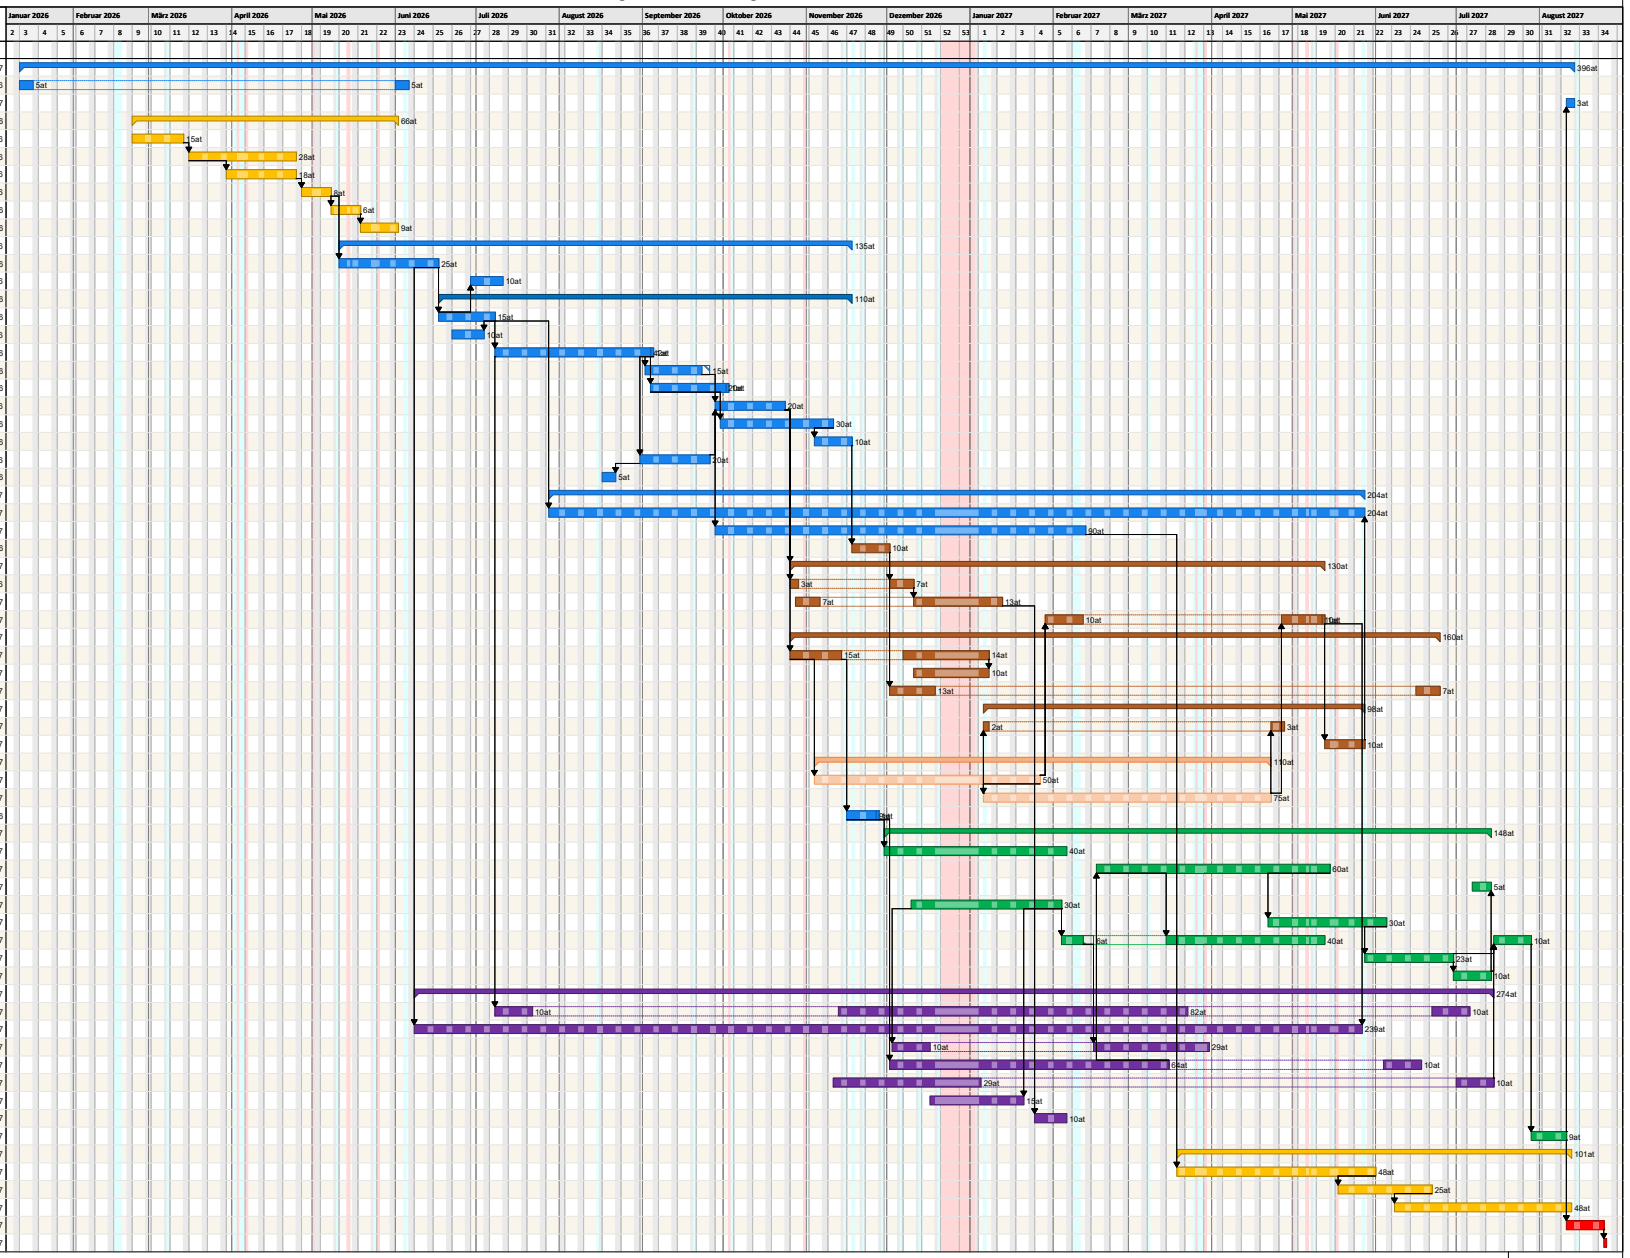
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Baustelleneinrichtung	396at	Mo, 12.01.26	Fr, 13.08.27
1.1	Aufbau Baustelleneinrichtung	100at	Mo, 12.01.26	Fr, 05.06.26
1.2	Abbau Baustelleneinrichtung	3at	Mi, 11.08.27	Fr, 13.08.27
2	Erschließungsarbeiten	66at	Mo, 23.02.26	Mo, 01.06.26
2.1	BE und Aufnahme MuBo für Baustraße	15at	Mo, 23.02.26	Fr, 13.03.26
2.2	Verlegen SW-/RW-Kanal u.a. Medien	28at	Mo, 16.03.26	Fr, 24.04.26
2.3	Herstellen Baustraße	18at	Mo, 30.03.26	Fr, 24.04.26
2.4	Kanal-Gebäude-Zuführung	8at	Mo, 27.04.26	Do, 07.05.26
2.5	Ölabscheider	6at	Fr, 08.05.26	Mo, 18.05.26
2.6	Wasser-, Strom-Zuleitung, Leerrohre	9at	Di, 19.05.26	Mo, 01.06.26
3	Erweiterte Rohbauarbeiten	135at	Mo, 11.05.26	Di, 17.11.26
3.1	Erdarbeiten und Grundleitungen	25at	Mo, 11.05.26	Di, 16.06.26
3.2	Drän- und Versickerungsarbeiten	10at	Mo, 29.06.26	Fr, 10.07.26
3.3	Beton-/Stahlbetonarbeiten	110at	Mi, 17.06.26	Di, 17.11.26
3.3.1	Fundamente und Sohlplatte	15at	Mi, 17.06.26	Di, 07.07.26
3.3.2	Flächenheizung in Betonsohle	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
3.3.3	Wände, Stützen und Treppe EG, FW	43at	Mi, 08.07.26	Fr, 04.09.26
3.3.4	Wände EG, RW	15at	Mi, 02.09.26	Di, 22.09.26
3.3.5	Decke EG, FW	21at	Fr, 04.09.26	Fr, 02.10.26
3.3.6	Decken über RW	20at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26
3.3.7	Wände und Stützen OG, FW	30at	Mi, 30.09.26	Di, 10.11.26
3.3.8	FT-Dachbinder und Decke, FW	10at	Mi, 04.11.26	Di, 17.11.26
3.4	Mauerarbeiten EG, RW	20at	Mo, 31.08.26	Fr, 25.09.26
3.5	Abdichtungsarbeiten	5at	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26
4	Gerüstarbeiten	204at	Di, 28.07.26	Do, 27.05.27
4.1	Gerüst FW	204at	Di, 28.07.26	Do, 27.05.27
4.2	Gerüst RW	90at	Mo, 28.09.26	Fr, 12.02.27
5	Holzbauarbeiten	10at	Mi, 18.11.26	Di, 01.12.26
6	Dachabdichtungsarbeiten	130at	Mo, 26.10.26	Mi, 12.05.27
6.1	Dampfsperre aufbringen	34at	Mo, 26.10.26	Do, 10.12.26
6.2	Dämmung und Abdichtung aufbringen	45at	Mi, 28.10.26	Di, 12.01.27
6.3	Attikaabschlüsse herstellen	71at	Fr, 29.01.27	Mi, 12.05.27
7	Metallbauarbeiten	160at	Mo, 26.10.26	Do, 24.06.27
7.1	Außentüren, -fenster, -PR-Fassaden	44at	Mo, 26.10.26	Do, 07.01.27
7.2	Sektionaltore	10at	Fr, 11.12.26	Do, 07.01.27
7.3	Innenstahl- und -Alu-türen	133at	Mi, 02.12.26	Do, 24.06.27
8	Stahlbauarbeiten	98at	Mi, 06.01.27	Do, 27.05.27
8.1	Balkondach	78at	Mi, 06.01.27	Di, 27.04.27
8.2	Leitern, Trennwand	10at	Do, 13.05.27	Do, 27.05.27
9	Wärmedämmverbundsystem m.Riemchen	110at	Mi, 04.11.26	Do, 22.04.27
9.1	WDVS RW	50at	Mi, 04.11.26	Di, 26.01.27
9.2	WDVS FW	75at	Mi, 06.01.27	Do, 22.04.27
10	Innenputzarbeiten	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26
11	Trockenbauarbeiten	148at	Mo, 30.11.26	Di, 13.07.27
11.1	Trockenbauwände	40at	Mo, 30.11.26	Fr, 05.02.27
11.2	Trockenbaudecken	60at	Mi, 17.02.27	Fr, 14.05.27
11.3	Sonstiges	5at	Mi, 07.07.27	Di, 13.07.27
12	Estricharbeiten	30at	Do, 10.12.26	Mi, 03.02.27
13	Fliesenarbeiten	30at	Do, 22.04.27	Fr, 04.06.27
14	Maler- und Beschichtungsarbeiten	67at	Do, 04.02.27	Mi, 12.05.27
15	Bodenbelagsarbeiten	23at	Fr, 28.05.27	Di, 29.06.27
16	Innentüren	10at	Mi, 30.06.27	Di, 13.07.27
17	TGA-Leistungen	274at	Mo, 08.06.26	Mi, 14.07.27
17.1	Elektro (Stark- und Schwachstrom)	245at	Mi, 08.07.26	Mo, 05.07.27
17.2	Erdung / Blitzschutz	239at	Mo, 08.06.26	Mi, 26.05.27
17.3	Heizung	72at	Do, 03.12.26	Di, 30.03.27
17.4	Lüftung	128at	Mi, 02.12.26	Do, 17.06.27
17.5	Sanitär	162at	Mi, 11.11.26	Mi, 14.07.27
18	Aufzugsanlage	15at	Do, 17.12.26	Mi, 20.01.27
19	Aufbau Photovoltaik-Anlage	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
20	Bauendreinigung	9at	Do, 29.07.27	Di, 10.08.27
21	Wegebau / Außenanlagen	101at	Fr, 19.03.27	Do, 12.08.27
21.1	Südseite	48at	Fr, 19.03.27	Mo, 31.05.27
21.2	Ostseite	25at	Di, 18.05.27	Mo, 21.06.27
21.3	Nordseite	48at	Di, 08.06.27	Do, 12.08.27
22	Abnahmen / Nacharbeiten	10at	Mi, 11.08.27	Di, 24.08.27
23	Übergabe Bauherr	1at	Mi, 25.08.27	Mi, 25.08.27
